

# 施工階段

W-1 團隊名單				主辦機關	
				設計單位	
				生態團隊	
				監造、營造單位	
填表人員 (單位/職稱)	徐■ (台灣水資源與農業研究院/研究專員)	填表日期	114年09月26日		
主辦機關: <u>農業部農田水利署南投管理處</u>					
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長
工務組長	林■	-	27年	計畫負責人	土木、水利工程
設計股長	邱■	-	17年	計畫統籌	土木、水利工程
副工程司	李■	大專	28年	監造主辦	土木、水利工程
工程員	林■	國立屏東科技大學土壤與水 工程國際碩士學位學程	2年	監造協辦	土木、水利工程
營造單位: <u>威慶營造有限公司</u>					
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長
工地負責人	劉■	國中	41年	現場負責人	土木、水利工程 現場施作與管理
職員	賴■	高中	31年	施工者	土木、水利工程 現場施作
職員	劉■	高中	11年	施工者	土木、水利工程 現場施作
監造單位: <u>農業部農田水利署南投管理處</u>					
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長
工務組長	林■	-	27年	計畫負責人	土木、水利工程
工事股長	羅■	-	22年	計畫統籌	土木、水利工程
副工程司	李■	大專	28年	監造主辦	土木、水利工程
工程員	林■	國立屏東科技大學土壤與水 工程國際碩士學位學程	2年	監造協辦	土木、水利工程
生態團隊: <u>台灣水資源與農業研究院</u>					
職稱	姓名	學歷	專業資歷	負責工作	專長
副院長	蘇■	國立臺灣大學生物環境系統 工程學研究所博士	22年	生態檢核作業督導	生態檢核、農田灌溉 排水、景觀生態工 法、水文學、水土保

					持工程
所長	紀■	國立嘉義大學森林暨自然保育碩士	10年	生態檢核調查作業、研擬保育措施	森林經營、遙感探測技術、樣區調查與規劃
研究專員	林■	國立中興大學生命科學系碩士	2年	生態檢核調查、研擬保育措施	兩生類動物學、動物行為學、野外生物調查
研究專員	曲■	國立臺灣海洋大學海洋環境與生態研究所碩士	2年	生態檢核調查作業、表單填寫	珊瑚礁生態學、魚類學、生態插圖設計
研究專員	徐■	國立暨南國際大學土木工程學系博士	3年	生態檢核調查作業、表單填寫	水處理工程、水質處理分析、環境教育


備註：

1. 第一級生態檢核由**主辦機關、營造單位、監造單位**與**生態團隊**填寫。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關、營造單位、監造單位**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助工程人員執行生態檢核

W-2 施工前生態保育措施確認表 (工區一)			主辦機關 設計單位 生態團隊 監造、營造單位
填表人員 (單位/職稱)	[Redacted]	填表日期	113 年 01 月 16 日
主辦機關負責人 (單位/職稱)	[Redacted] 南投管理處魚池工作站	監造單位負責人 (單位/職稱)	[Redacted] 南投管理處魚池工作站
營造單位負責人 (單位/職稱)	[Redacted] 威慶營造	生態人員 (單位/職稱)	[Redacted] 台灣水資源與農業研究院/研究專員
項次	生態保育策略	生態保育措施	參採情形
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
2	減輕	工程施作應避免飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
3	減輕	工程施作產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
4	減輕	工程施作禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下，以減少路殺機率。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
6	減輕	各處工區應以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區，並以裸露地或草地等低敏感區域銜接至施作目標渠道。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
8	減輕	設置動物通道連接水陸域棲地。	<input type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input checked="" type="checkbox"/> 未納入，原因：視情況調整
9	減輕	導流維持常流水並設置臨時沉沙池。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
10	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，以降低對野生動物活動之干擾。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
(欄位請自行增列)			
檢查項目	說明		檢查情形

檢查項目	說明	檢查情形
施工計畫	施工廠商是否將生態人員、生態保育措施自主檢查表、生態保育措施平面圖、工地環境生態異常情況處理計畫納入施工計畫說明書?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____
環境保護及生態保育教育訓練	是否於開工前針對施工人員辦理環境保護及生態保育教育訓練，宣導關注物種、生態保全對象及生態保育措施等事項?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____
其它(可依個案需求新增)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____

生態保育措施平面圖：

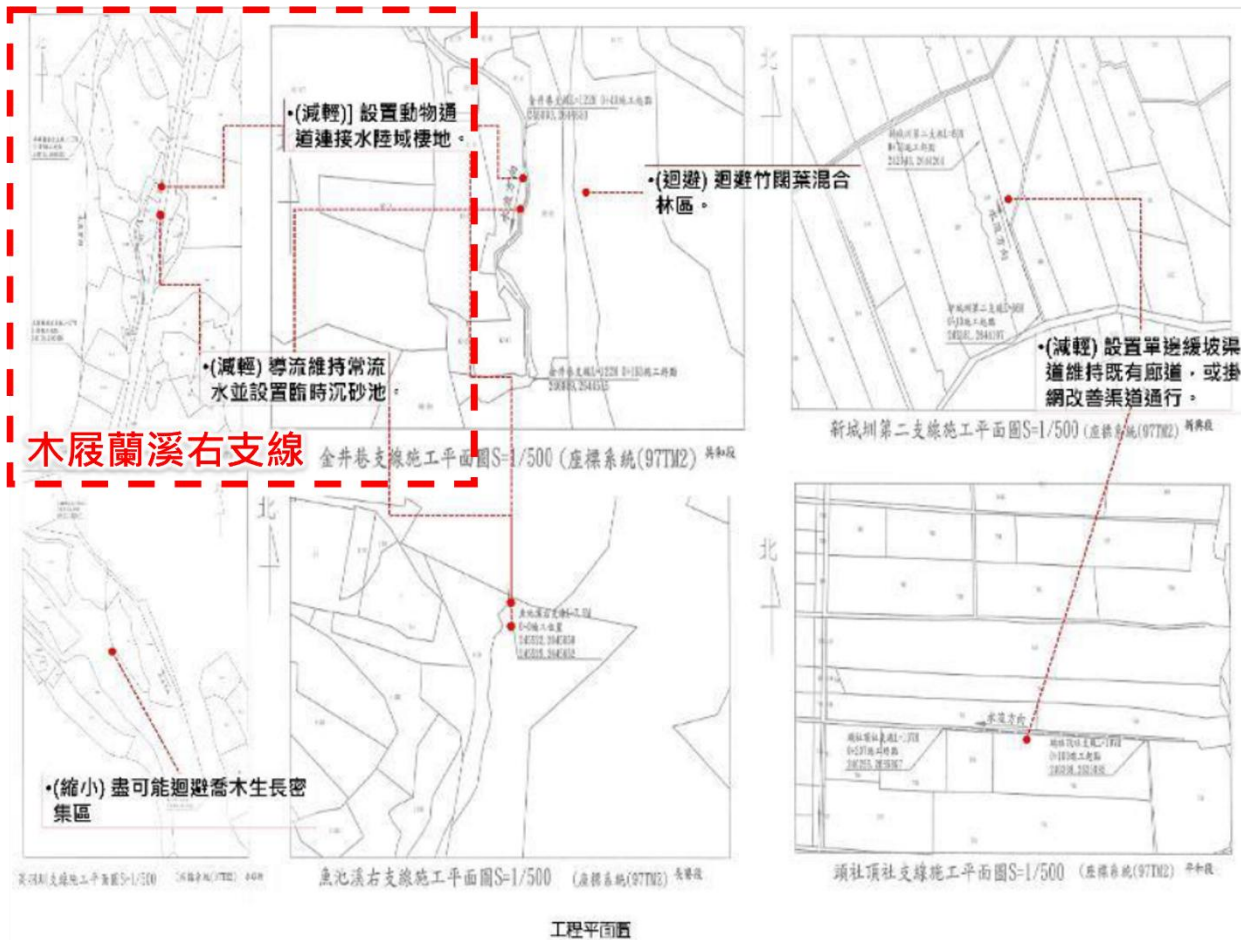

其他生態友善措施說明：

1. (減輕) 施工前針對相關人員實施生態教育訓練。
2. (減輕) 工程施作應避免飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。
3. (減輕) 工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下班帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物覓食。
4. (減輕) 工程施作禁止相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置。
5. (迴避) 工程施作應限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，以降低對野生動物活動之干擾。
6. (減輕) 工區內及周邊施作相關車輛行進時速度應限於30以下，以減少路殺機率。
7. (減輕) 各處工程應以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區，並以裸露地或草地等低敏感區域銜接至施作目標渠道。
8. (減輕) 工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。


備註：

1. 第一級生態檢核由生態團隊填寫，並與主辦機關、監造、營造單位共同確認生態保育措施可行性。
2. 第二級生態檢核由主辦機關填寫，並可視需求邀請生態團隊協助工程人員填寫本表。

W-2 施工前生態保育措施確認表 (工區二)			主辦機關 設計單位 生態團隊 監造、營造單位
填表人員 (單位/職稱)	[Redacted]	填表日期	113年01月16日
主辦機關負責人 (單位/職稱)	[Redacted] 南投管理處魚池工作站	監造單位負責人 (單位/職稱)	[Redacted] 南投管理處魚池工作站
營造單位負責人 (單位/職稱)	[Redacted] 威慶營造	生態人員 (單位/職稱)	[Redacted] 台灣水資源與農業研究院/研究專員
項次	生態保育策略	生態保育措施	參採情形
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
2	減輕	工程施作應避免飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
3	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
4	減輕	工程施作禁止相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於30以下，以減少路殺機率。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
6	減輕	各處工區應以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區，並以裸露地或草地等低敏感區域銜接至施作目標渠道。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
8	減輕	設置動物通道連接水陸域棲地。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
9	減輕	導流維持常流水並設置臨時沉沙池。	<input type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input checked="" type="checkbox"/> 未納入，原因： <u>視現地調整</u>
10	迴避	迴避竹闊葉混合林區 → 迴避火燒柯1棵	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
11	迴避	工程施作應限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，以降低對野生動物活動之干擾。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
(欄位請自行增列)			

檢查項目	說明	檢查情形
施工計畫	施工廠商是否將生態人員、生態保育措施自主檢查表、生態保育措施平面圖、工地環境生態異常情況處理計畫納入施工計畫說明書?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____
環境保護及生態保育教育訓練	是否於開工前針對施工人員辦理環境保護及生態保育教育訓練，宣導關注物種、生態保全對象及生態保育措施等事項?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____
其它(可依個案需求新增)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____

生態保育措施平面圖：見下頁

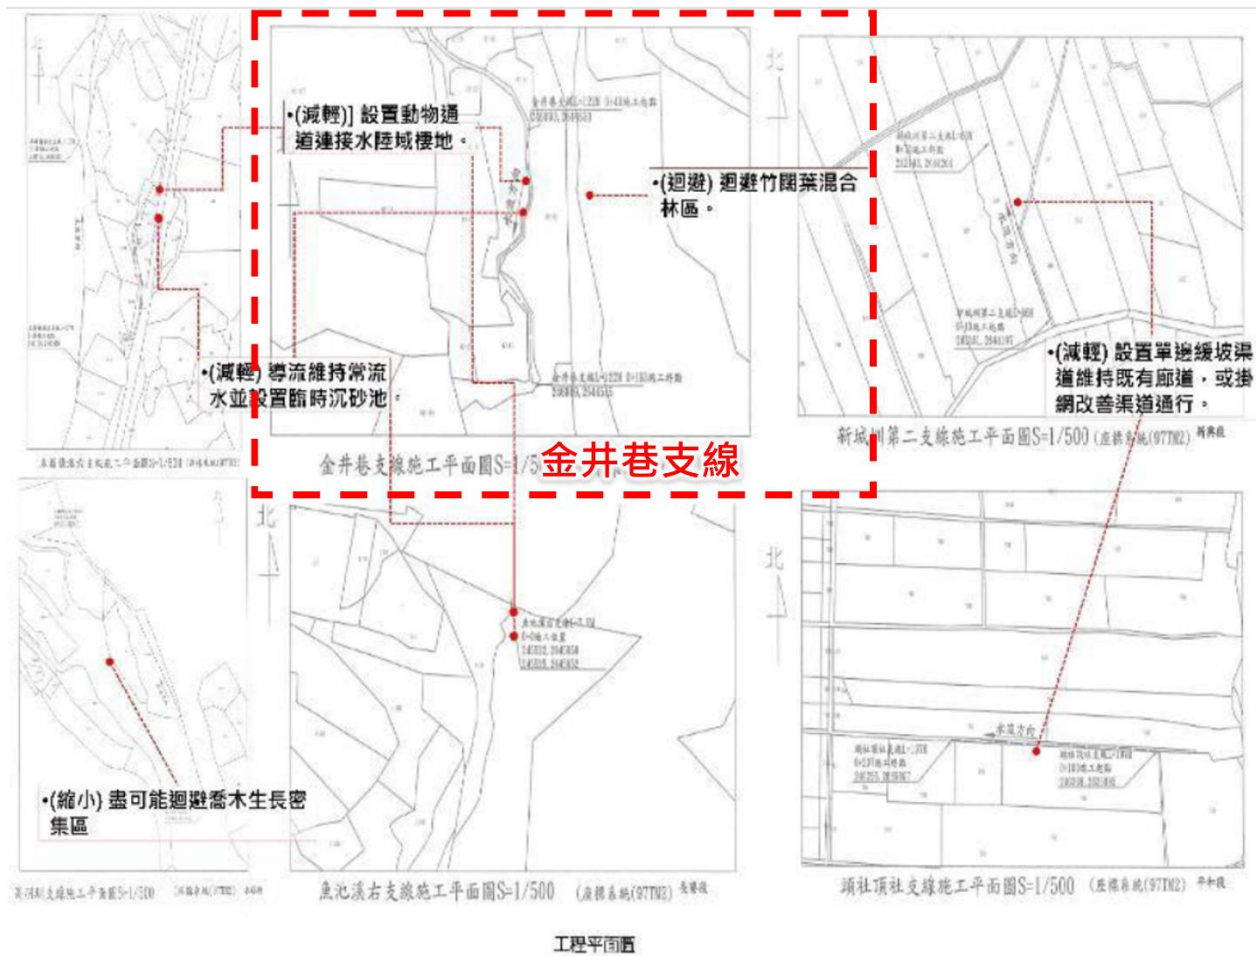

其他生態友善措施說明：

- (減輕) 施工前針對相關人員實施生態教育訓練。
- (減輕) 工程施作應避免飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之騷擾壓力。
- (減輕) 工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。
- (減輕) 工程施作禁止相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置。
- (迴避) 工程施作應限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，以降低對野生動物活動之干擾。
- (減輕) 工區內及周邊施作相關車輛行進時速度限於30以下，以減少路殺機率。
- (減輕) 各處工程應以靠近道路或農路為施工便道及物料暫置區，並以採草地或草地等低敏感區域銜接至施作目標渠道。
- (減輕) 工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清離工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。

- 第一級生態檢核由生態團隊填寫，並與主辦機關、監造、營造單位共同確認生態保育措施可行性。
- 第二級生態檢核由主辦機關填寫，並可視需求邀請生態團隊協助工程人員填寫本表。


## W-2 施工前生態保育措施確認表 (工區三)

主辦機關  
設計單位  
生態團隊  
監造、營造單位

填表人員 (單位/職稱)	[Redacted]	填表日期	113年01月16日
主辦機關負責人 (單位/職稱)	[Redacted] 南投管理處魚池工作站	監造單位負責人 (單位/職稱)	[Redacted] 南投管理處魚池工作站
營造單位負責人 (單位/職稱)	[Redacted] 威慶營造	生態人員 (單位/職稱)	[Redacted] 台灣水資源與農業研究院/研究專員
項次	生態保育策略	生態保育措施	參採情形
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
2	減輕	工程施作應避免飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
3	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
4	減輕	工程施作禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於30以下，以減少路殺機率。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
6	減輕	各處工區應以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區，並以裸露地或草生地等低敏感區域銜接至施作目標渠道。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
8	減輕	設置單邊緩坡渠道維持既有廊道，或掛網改善渠道通行。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
9	迴避	工程施作應限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，以降低對野生動物活動之干擾。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
(欄位請自行增列)			
檢查項目	說明	檢查情形	
施工計畫	施工廠商是否將生態人員、生態保育措施自主檢查表、生態保育措施平面圖、工地環境生態異常情況處理計畫	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____	

環境保護及生態保育教育訓練	是否於開工前針對施工人員辦理環境保護及生態保育教育訓練，宣導關注物種、生態保全對象及生態保育措施等事項？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____
其它(可依個案需求新增)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____

生態保育措施平面圖：

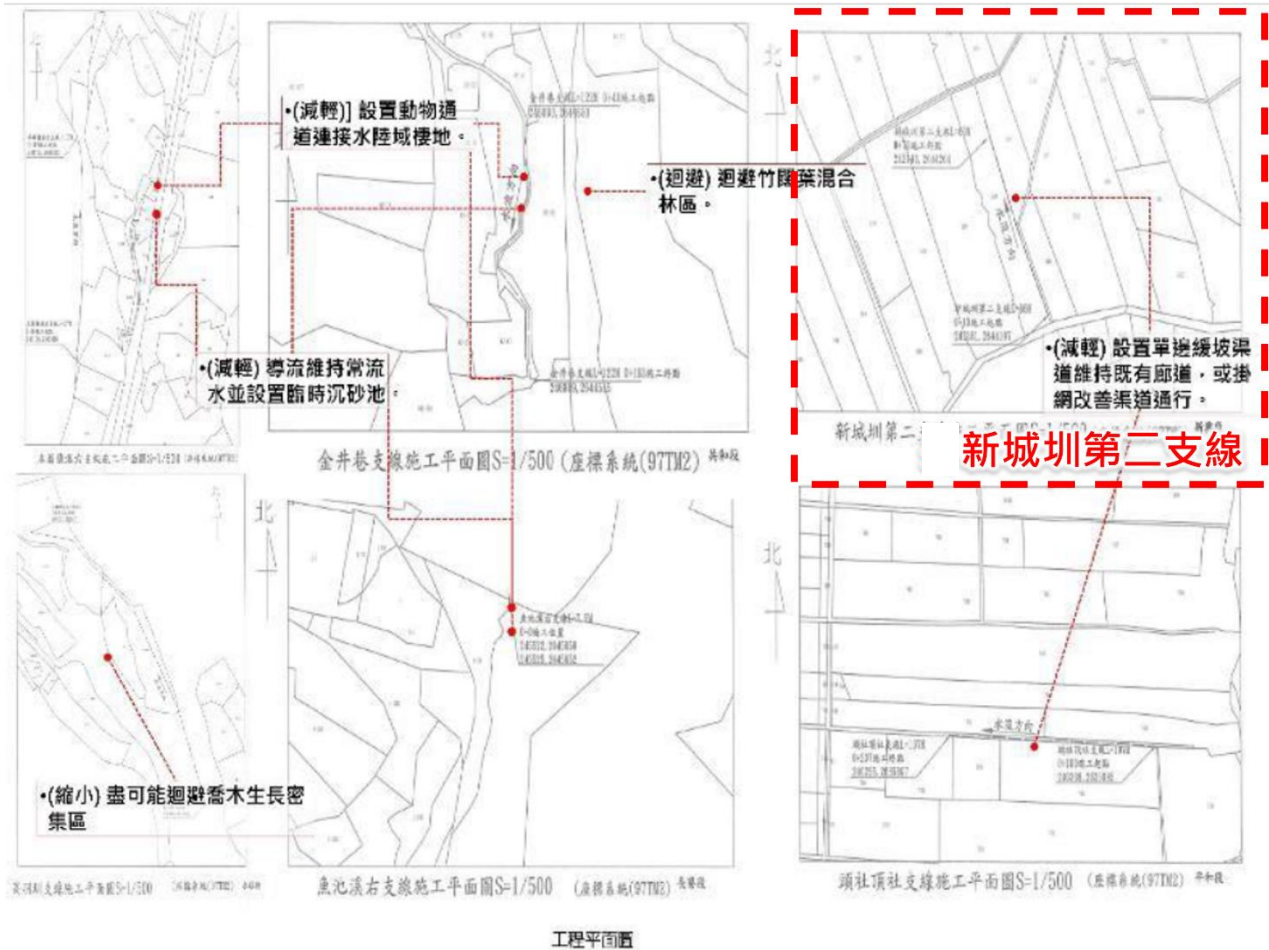

其他生態友善措施說明：

1. (減輕) 施工前針對相關人員實施生態教育訓練。
2. (減輕) 工程施作應避免飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。
3. (減輕) 工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。
4. (減輕) 工程施作禁止相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷應即時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置。
5. (迴避) 工程施作應限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，以降低對野生動物活動之干擾。
6. (減輕) 工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於30以下，以減少路殺機率。
7. (減輕) 各處工程應以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區，並以裸地或草地等低敏感區域銜接至施作目標渠道。
8. (減輕) 工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清除工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。

備註：

1. 第一級生態檢核由生態團隊填寫，並與主辦機關、監造、營造單位共同確認生態保育措施可行性。
2. 第二級生態檢核由主辦機關填寫，並可視需求邀請生態團隊協助工程人員填寫本表。

## W-2 施工前生態保育措施確認表 (工區四)


主辦機關  
設計單位  
生態團隊  
監造、營造單位

填表人員 (單位/職稱)	[Redacted]	填表日期	113年01月16日
主辦機關負責人 (單位/職稱)	[Redacted] 南投管理處魚池工作站	監造單位負責人 (單位/職稱)	[Redacted] 南投管理處魚池工作站
營造單位負責人 (單位/職稱)	[Redacted] 威慶營造	生態人員 (單位/職稱)	[Redacted] 台灣水資源與農業研究院/研究專員
項次	生態保育策略	生態保育措施	參採情形
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
2	減輕	工程施作應避免飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
3	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
4	減輕	工程施作禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下，以減少路殺機率。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
6	減輕	各處工區應以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區，並以裸露地或草生地等低敏感區域銜接至施作目標渠道。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
8	縮小	盡可能迴避喬木生長密集區	<input type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input checked="" type="checkbox"/> 未納入，原因： <u>無特殊密林</u>
9	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，以降低對野生動物活動之干擾。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____

(欄位請自行增列)

檢查項目	說明	檢查情形
施工計畫	施工廠商是否將生態人員、生態保育措施自主檢查表、生態保育措施平面圖、工地環境生態異常情況處理計畫納入施工計畫說明書?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____
環境保護及生態保育教育訓練	是否於開工前針對施工人員辦理環境保護及生態保育教育訓練，宣導關注物種、生態保全對象及生態保育措施等事項?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____
其它(可依個案需求新增)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____

生態保育措施平面圖：見下頁

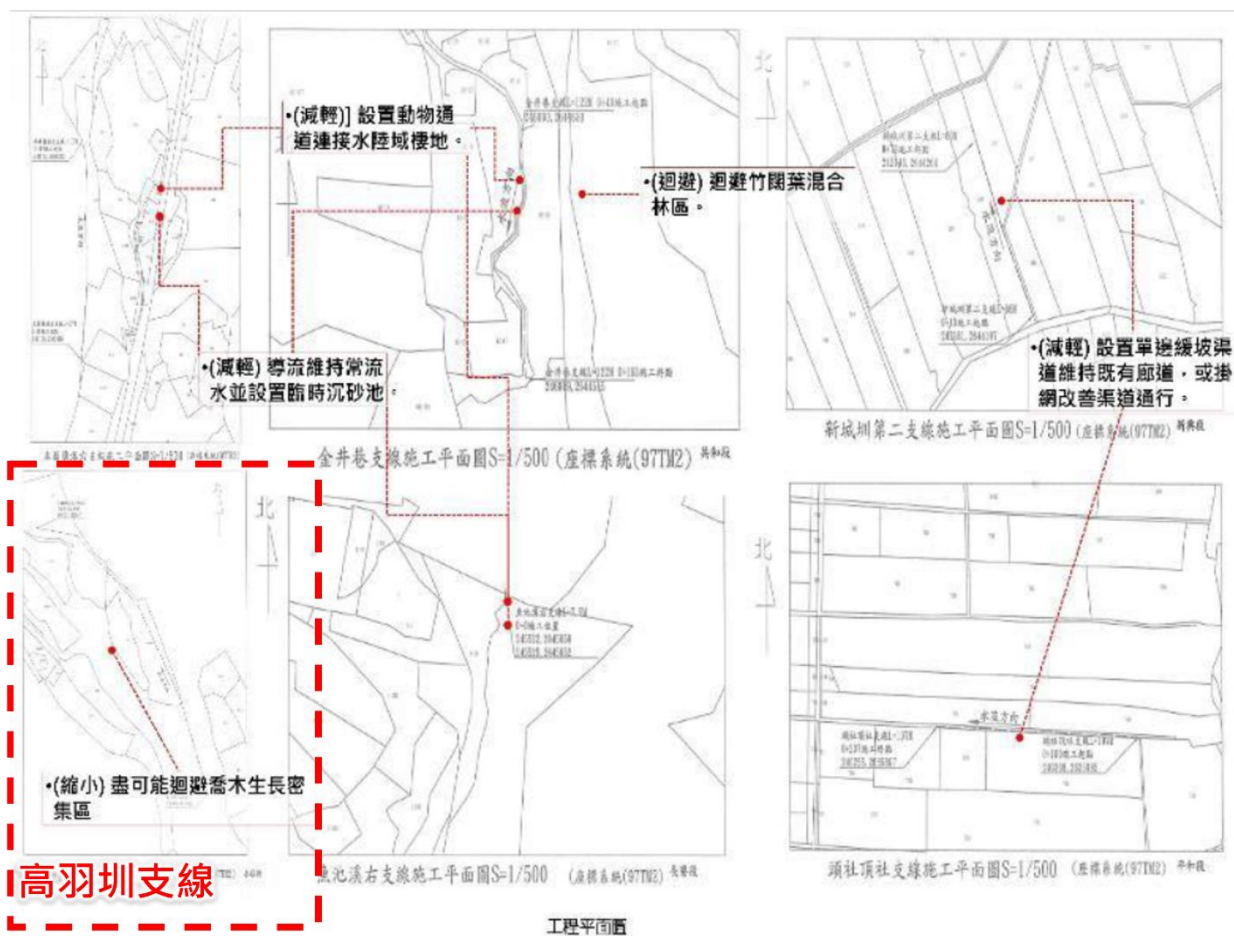

其他生態友善措施說明：

- (減輕) 施工前針對相關人員實施生態教育訓練。
- (減輕) 工程施作應避免餵養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。
- (減輕) 工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下班帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。
- (減輕) 工程施作禁止相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置。
- (迴避) 工程施作應限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，以降低對野生動物活動之干擾。
- (減輕) 工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於30以下，以減少路殺機率。
- (減輕) 各處工程應以靠近道路或農路為施工便道及物料暫置區，並以裸露地或草地等低敏感區域銜接至施作目標深道。
- (減輕) 工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，並於完工後清除工區，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。

備註：

- 第一級生態檢核由生態團隊填寫，並與主辦機關、監造、營造單位共同確認生態保育措施可行性。
- 第二級生態檢核由主辦機關填寫，並可視需求邀請生態團隊協助工程人員填寫本表。


## W-2 施工前生態保育措施確認表 (工區五)

主辦機關  
設計單位  
生態團隊  
監造、營造單位

填表人員 (單位/職稱)	[Redacted] 院	填表日期	113 年 01 月 16 日
主辦機關負責人 (單位/職稱)	[Redacted] 南投管理處魚池工作站	監造單位負責人 (單位/職稱)	[Redacted] 南投管理處魚池工作站
營造單位負責人 (單位/職稱)	[Redacted] 威慶營造	生態人員 (單位/職稱)	[Redacted] 台灣水資源與農業研究院 研究專員
項次	生態保育策略	生態保育措施	參採情形
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input checked="" type="checkbox"/> 未納入，原因：該區取消施作
2	減輕	工程施作應避免飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input checked="" type="checkbox"/> 未納入，原因：該區取消施作
3	減輕	工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下班帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input checked="" type="checkbox"/> 未納入，原因：該區取消施作
4	減輕	工程施作禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置。	<input type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input checked="" type="checkbox"/> 未納入，原因：該區取消施作
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下，以減少路殺機率。	<input type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input checked="" type="checkbox"/> 未納入，原因：該區取消施作
6	減輕	各處工區應以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區，並以裸露地或草生地等低敏感區域銜接至施作目標渠道。	<input type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input checked="" type="checkbox"/> 未納入，原因：該區取消施作
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input checked="" type="checkbox"/> 未納入，原因：該區取消施作
8	減輕	設置動物通道連接水陸域棲地。	<input type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input checked="" type="checkbox"/> 未納入，原因：該區取消施作
9	減輕	導流維持常流水並設置臨時沉沙池。	<input type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input checked="" type="checkbox"/> 未納入，原因：該區取消施作
10	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，以降低對野生動物活動之干擾。	<input type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input checked="" type="checkbox"/> 未納入，原因：該區取消施作

檢查項目	說明	檢查情形
施工計畫	施工廠商是否將生態人員、生態保育措施自主檢查表、生態保育措施平面圖、工地環境生態異常情況處理計畫納入施工計畫說明書?	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 原因: 該工區取消施作
環境保護及生態保育教育訓練	是否於開工前針對施工人員辦理環境保護及生態保育教育訓練, 宣導關注物種、生態保全對象及生態保育措施等事項?	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 原因: 該工區取消施作
其它(可依個案需求新增)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 原因: _____

生態保育措施平面圖: 見下頁

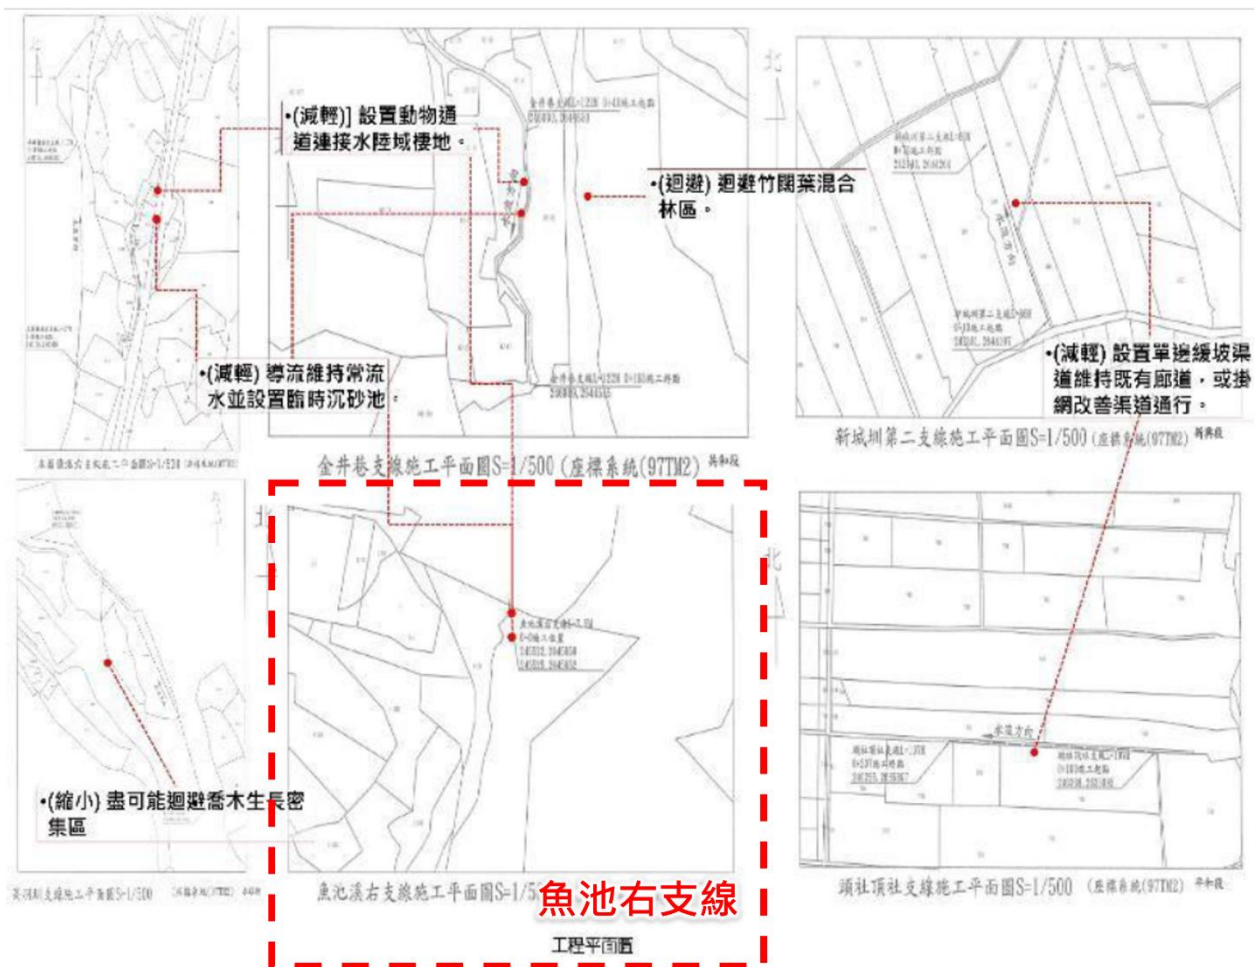

其他生態友善措施說明:

1. (減輕) 施工前針對相關人員實施生態教育訓練。
2. (減輕) 工程施作應避免飼養或投餵犬貓, 避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。
3. (減輕) 工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等, 應妥善包裹並隨每日下班帶離工區, 避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物覓食。
4. (減輕) 工程施作禁止相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物, 若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置。
5. (迴避) 工程施作應限於每日早上8點至下午5點, 避免晨昏施作, 並禁止夜間施作, 以降低對野生動物活動之干擾。
6. (減輕) 工區內及周邊施作相關車輛行進時速限於30以下, 以減少道路機車。
7. (減輕) 各處工程應以靠近道路或農路為施工便道及物料暫置區, 並以裸地或草生地等低敏感區域銜接至施作目標渠道。
8. (減輕) 工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放, 並於完工後清理工區, 禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。


備註:

1. 第一級生態檢核由生態團隊填寫, 並與主辦機關、監造、營造單位共同確認生態保育措施可行性。
2. 第二級生態檢核由主辦機關填寫, 並可視需求邀請生態團隊協助工程人員填寫本表。

W-2 施工前生態保育措施確認表 (工區六)			主辦機關 設計單位 生態團隊 監造、營造單位
填表人員 (單位/職稱)	[Redacted]	填表日期	113 年 01 月 16 日
主辦機關負責人 (單位/職稱)	南投管理處魚池工作站	監造單位負責人 (單位/職稱)	南投管理處魚池工作站
營造單位負責人 (單位/職稱)	威慶營造	生態人員 (單位/職稱)	台灣水資源與農業研究院/研究專員
項次	生態保育策略	生態保育措施	參採情形
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
2	減輕	工程施作應避免飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
3	減輕	工程施作產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
4	減輕	工程施作禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下，以減少路殺機率。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
6	減輕	各處工區應以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區，並以裸露地或草地等低敏感區域銜接至施作目標渠道。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
8	減輕	設置單邊緩坡渠道維持既有廊道，或掛網改善渠道通行。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
9	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，以降低對野生動物活動之干擾。	<input checked="" type="checkbox"/> 已納入工程計畫方案 <input type="checkbox"/> 未納入，原因：_____
(欄位請自行增列)			
檢查項目	說明		檢查情形
施工計畫	施工廠商是否將生態人員、生態保育措施自主檢查表、生態保育措施平面圖、工地環境生態異常情況處理計畫納入施工		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，原因：_____

檢查項目	說明	檢查情形
施工計畫	施工廠商是否將生態人員、生態保育措施自主檢查表、生態保育措施平面圖、工地環境生態異常情況處理計畫納入施工計畫說明書?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 原因: _____
環境保護及生態保育教育訓練	是否於開工前針對施工人員辦理環境保護及生態保育教育訓練, 宣導關注物種、生態保全對象及生態保育措施等事項?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 原因: _____
其它(可依個案需求新增)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 原因: _____

生態保育措施平面圖: 見下頁

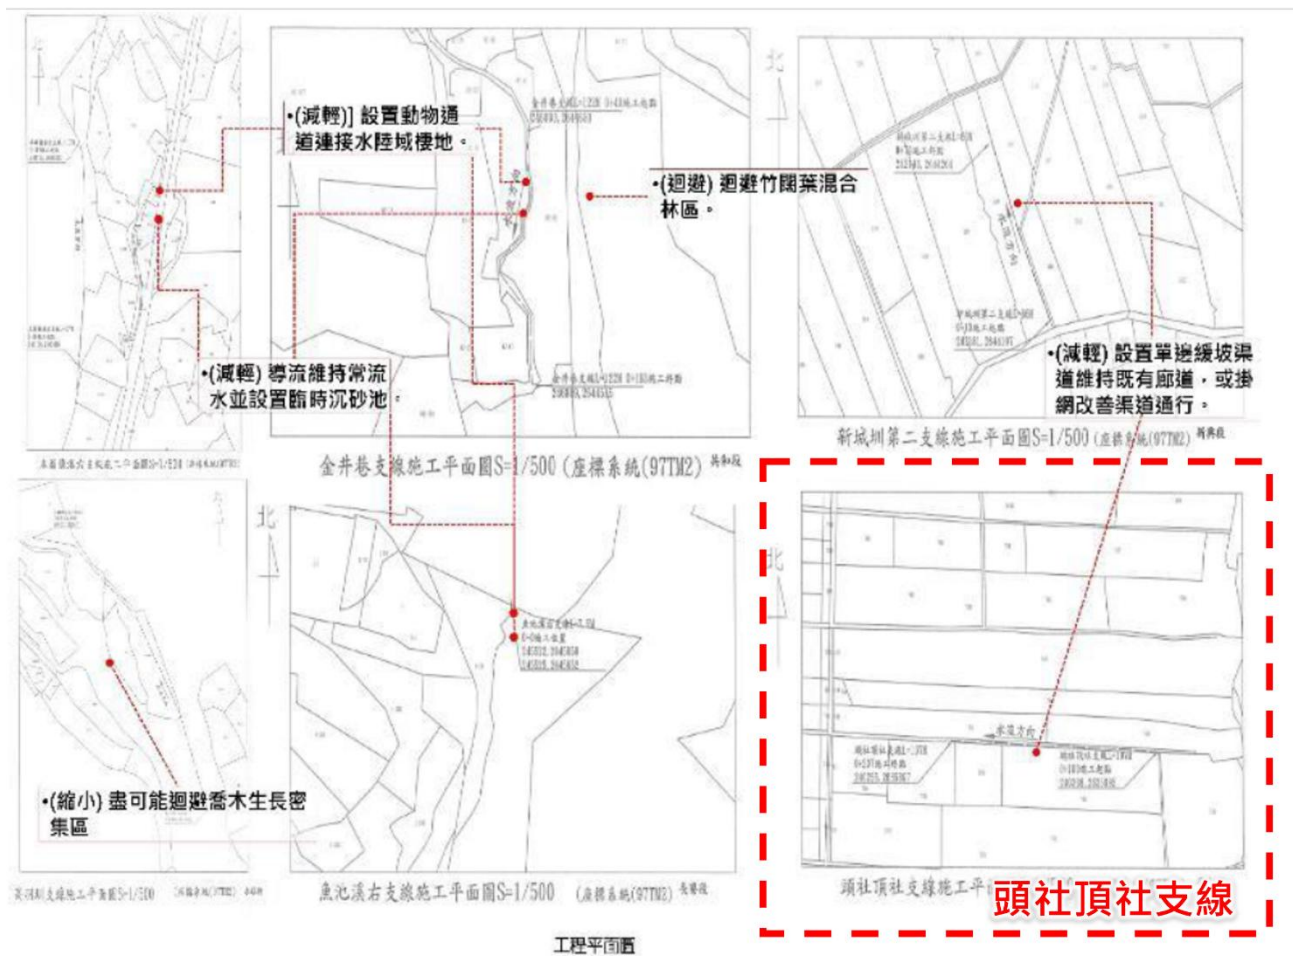

其他生態友善措施說明:

1. (減輕) 施工前針對相關人員實施生態教育訓練。
2. (減輕) 工程施作應避免飼養或投餵犬貓, 避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。
3. (減輕) 工程施作產生之民生廢棄物如廚餘等, 應妥善包裹並每日下工帶離工區, 避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物覓食。
4. (減輕) 工程施作禁止相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物, 若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置。
5. (迴避) 工程施作應限於每日早上8點至下午5點, 避免晨昏施作, 並禁止夜間施作, 以降低對野生動物活動之干擾。
6. (減輕) 工區內及周邊施作相關車輛行進時速限於30以下, 以減少道路機車。
7. (減輕) 各處工程應以靠近道路或農路為施工便道及物料暫置區, 並以裸地或草地等低敏感區域銜接至施作目標渠道。
8. (減輕) 工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放, 並於完工後清理工區, 禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。

備註:



1. 第一級生態檢核由生態團隊填寫, 並與主辦機關、監造、營造單位確認生態保育措施可行性。
2. 第二級生態檢核由主辦機關填寫, 並可視需求邀請生態團隊協助工程人員填寫本表。


## 頭社頂社支線等圳強化工程


### W-4 施工中生態保育措施自主檢查表(營造)統整表

編號	自主檢查月份	檢查日期	異常狀況	工程施工備註*
1	114 年 02 月份	114/02/24	無	僅施作工區 6 且完工； 其餘工區尚未施作
2	114 年 03 月份	114/03/13	無	工區 1、3 尚未施作； 工區 2、4 施工中
3	114 年 04 月份	114/04/18	無	工區 3 尚未施作； 工區 1、2、4 施工中
4	114 年 05 月份	114/05/07	無	工區 3 尚未施作； 工區 1、2、4 施工中
5	114 年 06 月份	114/06/11	無	工區 1、2 完工； 工區 3、4 施工中
6	114 年 07 月份	114/07/15	無	工區 3、4 完工
<p>備註：</p> <p>1.工區編號及名稱：</p> <p>(1) 工區 1 木屐蘭溪右支線                      (2) 工區 2 金井巷支線                      (3) 工區 3 新城圳第二支線                      (4) 工區 4 高羽圳支線                      (5) 工區 5 已取消                      (6) 工區 6 頭社頂社支線</p> <p>2.說明：</p> <p>本案自 114 年 02 月至 114 年 07 月共執行 6 次施工中抽查作業，各工區自施工前至完工之抽查次數，分別為工區 1：4 次、工區 2：4 次、工區 3：5 次、工區 4：5 次、工區 6：1 次，共計 19 份生態保育措施抽查表，施工過程皆無異常狀況發生。</p>				

\*營造生態團隊(森鄰生態有限公司)各工區歷次抽查之紀錄表


W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)					主辦機關		
					設計單位		
工程名稱					生態團隊		
					監造單位		
頭社頂社支線等圳強化工程 (木屐蘭溪右支線)					營造單位		
					施工期程		
114年1月16日~114年7月14日 共179日					抽查日期		
114年01月22日					主辦機關負責人 (單位/職稱)		
李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師					監造單位負責人 (單位/職稱)		
李■■■ 南投管理處魚池工作站/副工程師					營造單位負責人 (單位/職稱)		
劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人					生態人員 (單位/職稱)		
徐■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員							
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	本團隊與主辦機關討論挖掘土堆放置位置	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	已跟廠商進行教育訓練	
8	減輕	導流維持常流水並設置臨時沉砂池	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	本團隊與主辦機關討論沉砂池位置及河道保留寬度	


9	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	已跟廠商進行教育訓練	
---	----	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)				主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位			
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (木屐蘭溪右支線)		施工期程		114年1月16日~114年7月14日 共179日		
			抽查日期		114年01月22日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不 合格	尚 未 執 行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	


4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	本團隊與主辦機關討論挖掘土堆放置位置	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	已跟廠商進行教育訓練	
8	減輕	導流維持常流水並設置臨時沉砂池	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	本團隊與主辦機關討論沉砂池位置及河道保留寬度	


9	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	已跟廠商進行教育訓練	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 本表由**監造單位**填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)					主辦機關		
					設計單位		
工程名稱					生態團隊		
					監造單位		
頭社頂社支線等圳強化工程 (木屐蘭溪右支線)					營造單位		
					施工期程		
114年1月16日~114年7月14日 共179日					抽查日期		
114年02月10日					主辦機關負責人 (單位/職稱)		
李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師					監造單位負責人 (單位/職稱)		
李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師					營造單位負責人 (單位/職稱)		
劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人					生態人員 (單位/職稱)		
徐■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員							
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	




4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本團隊與主辦機關討論挖掘土堆放置位置	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	已跟廠商進行教育訓練	
8	減輕	導流維持常流水並設置臨時沉砂池	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本團隊與主辦機關討論沉砂池位置及河道保留寬度	


9	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	已跟廠商進行教育訓練	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)				主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位			
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (木屐蘭溪右支線)		施工工期		114年1月16日~114年7月14日 共179日		
			抽查日期		114年02月10日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不 合格	尚 未 執 行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	本團隊與主辦機關討論挖掘土堆放置位置	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	已跟廠商進行教育訓練	
8	減輕	導流維持常流水並設置臨時沉砂池	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	本團隊與主辦機關討論沉砂池位置及河道保留寬度	

9	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	已跟廠商進行教育訓練	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 本表由**監造單位**填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




表3-1施工生態保育措施抽查表(工區1)






W-4施工生態保育措施自主檢查表(營造)					填寫單位	
					營造單位	
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區一-木屐蘭溪右支線)			施工期程		114年1月16日~114年7月14日共 179日
				抽查日期		114年2月24日
項次	生態保育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
4	減輕	施工期間禁止工程相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
6	減輕	以鄰近道路及農路做施工便道或臨時置料	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。


		區使用，並以裸露地或草地等低敏感區域銜接至施作目標溝渠。				
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
8	減輕	工程施作期間進行導流，維持常流水，並於工區下游妥善設置臨時沉沙靜水設施。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
9	迴避	工程施作限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		感慶 劉 [redacted] 2/24		營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		蘇嘉仁/執行長 [redacted] 04/24

備註：

1. 本表由營造單位填寫，依據保育措施推動期程自主檢查，並由主辦機關、主辦生態團隊、監造單位協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.3「生態異常狀況處理表(營造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。


W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
工程名稱				生態團隊			
				監造單位			
頭社頂社支線等圳強化工程 (木屐蘭溪右支線)				營造單位			
				施工期程			
114年1月16日~114年7月14日 共179日				抽查日期			
114年03月20日				主辦機關負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		營造單位負責人 (單位/職稱)			
劉		威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)			
徐		台灣水資源與農業研究院/研究專員					
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	


4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本團隊與主辦機關討論挖掘土堆放置位置	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	已跟廠商進行教育訓練	
8	減輕	導流維持常流水並設置臨時沉砂池	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本團隊與主辦機關討論沉砂池位置及河道保留寬度	


9	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	已跟廠商進行教育訓練	
---	----	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------

備註：

1. 第一級生態檢核由生態團隊填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由主辦機關填寫，並可視需求邀請生態團隊協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)				主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位			
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (木屐蘭溪右支線)		施工工期		114年1月16日~114年7月14日 共179日		
			抽查日期		114年03月20日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不 合格	尚 未 執 行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本團隊與主辦機關討論挖掘土堆放置位置	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	已跟廠商進行教育訓練	
8	減輕	導流維持常流水並設置臨時沉砂池	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本團隊與主辦機關討論沉砂池位置及河道保留寬度	

9	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	已跟廠商進行教育訓練	
---	----	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------

備註：

1. 本表由**監造單位**填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

表3-1 施工中生 態保育措施抽查表(工區1)

W-4 施工中生 態保育措施自主檢查表(營造)					填寫單位	
					營造單位	
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區一-木屐蘭溪右支線)		施工期程		114年1月16日 114年7月14日共 179日	
			抽查日期		114年3月13日	
項次	生態保育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工前於工區現場辦理生態教育訓練，包含野生動物保育及救援，並說明施工期間注意事項及保土標的。</p> 
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>本工區尚未進場施作。</p> 
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>本工區尚未進場施作。</p>
4	減輕	施工期間禁止工程相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>本工區尚未進場施作。</p>

		若野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。				
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
6	減輕	以鄰近道路及農路做施工便道或臨時置料區使用，並以裸露地或旱生地等低敏感區域銜接至施作目標溝渠。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
8	減輕	工程施作期間進行導流，維持常流水，並於工區下游妥善設置臨時沉沙靜水設施。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
9	迴避	工程施作限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		威慶劉 [redacted] 3/13	營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		森霖 [redacted] 執行長 [redacted] 109.3.13	

備註：

1. 本表由營造單位填寫，依據保育措施推動期程自主檢查，並由主辦機關、主辦生態團隊、監造單位協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.3「生態異常狀況處理表(營造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。




W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)					主辦機關		
					設計單位		
工程名稱					生態團隊		
					監造單位		
頭社頂社支線等圳強化工程 (木屐蘭溪右支線)					營造單位		
					施工期程		
114年1月16日~114年7月14日 共179日					抽查日期		
114年04月21日					主辦機關負責人 (單位/職稱)		
李			農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		
李			農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		營造單位負責人 (單位/職稱)		
劉			威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		
徐			台灣水資源與農業研究院/研究專員				
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	與廠商進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商未有投餵野生犬貓行為	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無相關民生廢棄物	






4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無野生動物受困或受傷情形發生	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內相關交通用具皆低於限速 30 以下	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商以右岸做為便道及物料暫置區	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商未隨意棄置廢棄物	
8	減輕	導流維持常流水並設置臨時沉砂池	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	確實於上游處進行導流至工區外，並設置臨時沉砂池。	

9	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	■	□	□	工程施作確實避免晨昏施作
---	----	-------------------------------	---	---	---	--------------

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)				主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位			
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (木屐蘭溪右支線)		施工工期		114年1月16日~114年7月14日 共179日		
			抽查日期		114年04月21日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不 合格	尚 未 執 行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	與廠商進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商未有投餵野生犬貓行為	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無相關民生廢棄物	

4	減輕	<p>施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置</p>	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>無野生動物受困或受傷情形發生</p>	
5	減輕	<p>工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。</p>	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內相關交通用具皆低於限速 30 以下</p>	
6	減輕	<p>以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。</p>	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>營造廠商以右岸做為便道及物料暫置區</p>	
7	減輕	<p>廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為</p>	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>營造廠商未隨意棄置廢棄物</p>	
8	減輕	<p>導流維持常流水並設置臨時沉砂池</p>	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>確實於上游處進行導流至工區外，並設置臨時沉砂池。</p>	

9	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	■	□	□	工程施作確實避免晨昏施作
---	----	-------------------------------	---	---	---	--------------

備註：

1. 本表由**監造單位**填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

表3-1施工中生態保育措施抽查表(工區1)

W-4施工中生態保育措施自主檢查表(營造)					填寫單位	
					營造單位	
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區一-木屐蘭溪右支線)		施工期程		114年1月16日~114年7月14日共 179日	
			抽查日期		114年4月18日	
項次	生態保育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工前於工區現場辦理生態教育訓練，包含野生動物保育及救護，並說明施工期間注意事項及保全標的。</p> 
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未見飼養或投餵犬貓之行為。</p> 
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內無廚餘等民生廢棄物，不見流浪動物進入工區。</p> 
4	減輕	施工期間禁止工程相	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內無野生動物受困或受傷紀錄，周邊</p>




		關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。				多有野生動物活動，施作過程尚未發現石虎出沒。
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作相關車輛均緩速行進，無路殺紀錄。
6	減輕	以鄰近道路及農路做施工便道或臨時置料區使用，並以裸露地或草生地等低敏感區域銜接至施作目標溝渠。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	確實已右岸農路為便道及置料區，並堆置土坡便道進入溪床施作。  右岸便道  農路暫置物料
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程相關廢棄物確實集中堆放於右岸農路路緣，無任意處置現象。






						
8	減卸	工程施作期間進行導流，維持常流水，並於工區下游妥善設置臨時沉沙靜水設施。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>確實於施作區上游端將水流導向左側非施作區，並於施工區下游端設置臨時沉沙設施，維持淨水常流。</p>  <p>施作區上游端導水</p>  <p>施工下游端設有臨時沉砂設施</p>  <p>施作區下游端水色正常</p>
9	迴避	工程施作限於每日早上8點至下午5點，避	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實迴避晨昏且無夜間施作紀錄。

		免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。			
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)	威慶 劉 [redacted]	4/18	營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)	森永 執行長 陳 [redacted]	114.4.18

備註：

1. 本表由營造單位填寫，依據保育措施推動期程自主檢查，並由主辦機關、主辦生態團隊、監造單位協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.3「生態異常狀況處理表(營造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關		設計單位		生態團隊		監造單位		營造單位			
				工程名稱		頭社頂社支線等圳強化工程 (木屐蘭溪右支線)		施工期程		114年1月16日~114年7月14日 共179日		抽查日期		114年05月20日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片								
			合格	不合格	尚未執行										
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	與廠商進行保育措施確認									
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商未有投餵野生犬貓行為									
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無相關民生廢棄物									






4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無野生動物受困或受傷情形發生	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內相關交通用具皆低於限速 30 以下	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商以右岸做為便道及物料暫置區	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商未隨意棄置廢棄物	
8	減輕	導流維持常流水並設置臨時沉砂池	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	確實於上游處進行導流至工區外，並設置臨時沉砂池。	

9	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	■	□	□	工程施作確實避免晨昏施作
(欄位請自行新增)						

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)				主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位			
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (木屐蘭溪右支線)		施工工期		114年1月16日~114年7月14日 共179日		
			抽查日期		114年05月20日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不 合格	尚 未 執 行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	與廠商進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商未有投餵野生犬貓行為	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無相關民生廢棄物	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無野生動物受困或受傷情形發生	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內相關交通用具皆低於限速 30 以下	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商以右岸做為便道及物料暫置區	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商未隨意棄置廢棄物	
8	減輕	導流維持常流水並設置臨時沉砂池	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	確實於上游處進行導流至工區外，並設置臨時沉砂池。	

9	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	■	□	□	工程施作確實避免晨昏施作
---	----	-------------------------------	---	---	---	--------------

備註：

1. 本表由**監造單位**填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

表3-1施工中生態保育措施抽查表(工區1)




W-4施工中生態保育措施自主檢查表(營造)			填寫單位			
			營造單位			
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區一-木屐蘭溪右支線)		施工期程			114年1月16日~114年7月14日共 179日
			抽查日期			114年5月07日
項次	生態保育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前對相關人員實施生態教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工前於工區現場辦理生態教育訓練，也含野生動物保育及救援，並說明施工期間注意事項及保全標的。</p> 
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未見飼養或投餵犬貓之行為。</p> 
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內無廚餘等民生廢棄物，不見流浪動物進入工區。</p> 
4	減輕	施工期間禁止工程相	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內無野生動物受困或受傷紀錄，周邊</p>




		關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。				多有野生動物活動，施作過程尚未發現石虎出沒。
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作相關車輛均緩速行進，無路殺紀錄。
6	減輕	以鄰近道路及農路做施工便道或臨時置料區使用，並以裸露地或草地等低敏感區域銜接至施作目標溝渠。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>確實以右岸農路為便道及置料區，並堆置土坡便道進入溪床施作。</p>  <p>右岸便道</p>  <p>農路暫置物料</p>
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	本區施作近完成，工程相關廢棄物確實集中堆放於右岸農路路旁，無任意處置現象。

						
8	減輕	工程施作期間進行導流，維持常流水，並於工區下游妥善設置臨時沉沙靜水設施。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	本區施作近完成，逢降雨暫無施作行為，施作區上游端存續導流土坡，維持常流水。  施作區上游端導水
9	迴避	工程施作限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實迴避晨昏且無夜間施作紀錄。
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		  5/7			營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)   114.5.7	

備註：

1. 本表由營造單位填寫，依據保育措施推動期程自主檢查，並由主辦機關、主辦生態團隊、監造單位協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合合格事項，應填寫施工階段W-5.3「生態異常狀況處理表(營造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)					主辦機關		
					設計單位		
工程名稱					生態團隊		
					監造單位		
頭社頂社支線等圳強化工程 (木屐蘭溪右支線)					營造單位		
					施工期程		
114年1月16日~114年7月14日 共179日					抽查日期		
114年06月13日					主辦機關負責人 (單位/職稱)		
李			農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		
李			農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		營造單位負責人 (單位/職稱)		
劉			威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		
徐			台灣水資源與農業研究院/研究專員				
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	與廠商進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未有飼養投餵野生犬貓行為	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無相關民生廢棄物	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無野生動物受困或受傷情形發生	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內完工後相關交通用具已撤場	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工過程營造廠商以右岸做為便道及物料暫置區，完工後便道恢復情形良好，並無物料堆置。	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後無棄置廢棄物	
8	減輕	導流維持常流水並設置臨時沉砂池	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後已恢復原有河川流路	
9	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)					主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位		
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (木屐蘭溪右支線)		施工工期		114年1月16日~114年7月14日 共179日		
			抽查日期		114年06月13日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不 合格	尚 未 執 行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	與廠商進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未有飼養投餵野生犬貓行為	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無相關民生廢棄物	



4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無野生動物受困或受傷情形發生	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於30以下。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內完工後相關交通用具已撤場	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工過程營造廠商以右岸做為便道及物料暫置區，完工後便道恢復情形良好，並無物料堆置。	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商未隨意棄置廢棄物	
8	減輕	導流維持常流水並設置臨時沉砂池	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	確實於上游處進行導流至工區外，並設置臨時沉砂池。	
9	迴避	工程施作應限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 本表由**監造單位**填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

表3-1 施工中生態保育措施抽查表(工區1)

W-4 施工中生態保育措施自主檢查表(營造)					填寫單位	
					營造單位	
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區一-木屐蘭溪右支線)			施工期程		114年1月16日~114年7月14日共 179日
				抽查日期		114年6月11日
項次	生態保育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工前於工區現場辦理生態教育訓練，包含野生動物保育及救援，並說明施工期間注意事項及保全標的。</p> 
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未見飼養或投餵犬貓之行為。</p> 
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內無廚餘等民生廢棄物，不見流浪動物進入工區。</p> 
4	減輕	施工期間禁止工程相	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內無野生動物受困或受傷紀錄，周邊</p>

		關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。				多有野生動物活動，施作過程未發現石虎出沒。
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作相關車輛均緩速行進，無路殺紀錄，完工後相關車輛及人員已撤場。
6	減輕	以鄰近道路及農路做施工便道或臨時置料區使用，並以裸露地或草地等低敏感區域銜接至施作目標溝渠。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作過程確實以右岸農路為便道及置料區，並堆置土坡便道進入溪床施作，完工後便道恢復為高灘地，農路已無物料堆置。  右岸便道  工區整潔
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後工區無廢棄物遺留，工區整潔。

						
8	減輕	工程施作期間進行導流，維持常流水，並於工區下游妥善設置臨時沉沙靜水設施。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後上游導水土坡已復原，恢復原流路無阻隔。  上游端水域環境正常  下游端水域環境正常
9	迴避	工程施作限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作期間確實迴避晨昏且無夜間施作紀錄。
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)					營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期) 	


備註：

1. 本表由營造單位填寫，依據保育措施推動期程自主檢查，並由主辦機關、主辦生態團隊、監造單位協助確認。

2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整。

3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.3「生態異常狀況處理表(營造)」進行回報與追蹤。

4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。






W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
				生態團隊			
				監造單位			
				營造單位			
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (金井巷支線)		施工期程		114年1月16日~114年7月14日 共179日		
			抽查日期		114年02月26日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚 池工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合 格	不 合 格	尚 未 執 行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	

5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於30以下。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
8	減輕	設置動物通道連接水陸域棲地	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
9	迴避	迴避火燒柯(一棵)(23°54'20.1"N 120°58'08.6"E)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
10	迴避	工程施作應限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)				主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位			
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (金井巷支線)		施工工期		114年1月16日~114年7月14日 共179日		
			抽查日期		114年02月26日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不 合格	尚 未 執 行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	與主辦機關討論 工料暫置區域	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
8	減輕	設置動物通道連接水陸域棲地	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	與主辦機關進行 保育措施確認	

9	迴避	迴避火燒柯(一棵) (23°54'20.1"N 120°58'08.6"E)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施作，本團隊確認保全對象位置	
10	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	已與廠商進行教育訓練	

備註：

1. 本表由監造單位填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。


表3-2 施工中生態保育措施抽查表(工區2)





W-4施工中生態保育措施自主檢查表(營造)			填寫單位			
			營造單位			
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區二-金井巷支線)		施工期程		114年1月16日~114年7月14日共 179日	
			抽查日期		114年2月24日	
項次	生態保育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進行施作。
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進行施作。
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進行施作。
4	減輕	施工期間禁止工程相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進行施作。


5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進行施作。
6	減輕	以鄰近道路及農路做施工便道或臨時置料區使用，並以裸露地或草生地等低敏感區域銜接至施作目標溝渠。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進行施作。
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進行施作。
8	減輕	於工程樁號0K+100至0K+105設置1處動物斜坡道，連結水陸域棲地。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進行施作。
9	迴避	工程迴避既有大樹-火燒柯1株。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進行施作。
10	迴避	工程施作限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進行施作。
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		威慶 劉 [REDACTED] 2/24	營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		森霖 執行長 [REDACTED] 114/2/24	

備註：

1. 本表由營造單位填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應接續填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
工程名稱				生態團隊			
				監造單位			
頭社頂社支線等圳強化工程 (金井巷支線)				營造單位			
				施工期程			
114年1月16日~114年7月14日 共179日				抽查日期			
114年03月10日				主辦機關負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		營造單位負責人 (單位/職稱)			
劉		威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)			
徐		台灣水資源與農業研究院/研究專員					
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區未發生野生動物投餵情形	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等,應妥善包裹,避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無民生廢棄物	





4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內交通用具行駛時速皆低於 30 以下	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內以暨有農路做為施工便道及物料暫置區	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無廢棄物任意棄置並集中堆放	
8	減輕	設置動物通道連接水陸域棲地	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	動物通道尚未施作


9	迴避	迴避火燒柯(一棵)(23°54'20.1"N 120°58'08.6"E)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商已有進行迴避	
10	迴避	工程施作應限於每日早上8點至下午5點, 避免晨昏施作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)				主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位			
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (金井巷支線)		施工工期		114年1月16日~114年7月14日 共179日		
			抽查日期		114年03月10日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不 合格	尚 未 執 行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區未發生野生動物投餵情形	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無民生廢棄物	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於30以下。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內交通用具行駛時速皆低於30以下	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內以暨有農路做為施工便道及物料暫置區	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無廢棄物任意棄置並集中堆放	
8	減輕	設置動物通道連接水陸域棲地	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	尚未施工	動物通道尚未施作

9	迴避	迴避火燒柯(一棵) (23°54'20.1"N 120°58'08.6"E)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商已有進行迴避	
10	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							



備註：

1. 本表由監造單位填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

表3-2 施工中生態保育措施抽查表(工區2)

W-4施工中生態保育措施自主檢查表(營造)				填寫單位		
				營造單位		
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區二-金井巷支線)		施工期程		114年1月16日~114年7月14日共 179日	
			抽查日期		114年3月13日	
項次	生態保育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工前於工區內辦理生態教育訓練，包含野生動物保育及救援，並說明施工期間注意事項及保全標的。</p>  <p>教育訓練</p>  <p>保全對象指認</p>
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未見飼養或投餵流浪犬貓之行為，工區周邊未發現流浪犬貓徘徊之情形。</p>






						
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內及周邊未發現廚餘等民生廢棄物散落之情形。 
4	減輕	施工期間禁止工程相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工期間尚未發現野生動物受困工區。
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程車輛行進時速限制於30公里以下。
6	減輕	以鄰近道路及農路做施工便道或臨時置料區使用，並以裸露地或草地等低敏感區域銜接至施作目標溝渠。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	使用既有草地及農地做施工便道使用。 

7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未發現廢棄物任意棄置、焚燒及掩埋行為。</p> 	
8	減輕	於工程橋號0K+100至0K+105設置1處動物斜坡道，連結水陸域棲地。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>工程橋號0K+100至0K+105處尚未施作。</p>	
9	迴避	工程迴避既有大樹-火燒柯1株。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>保全對象火燒柯於施工前以警示帶標示圍圍，目前未受擾動。</p> 	
10	迴避	工程施作限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工程限制施工時間於早上8點至下午5點間，無夜間施工之情形。</p>	
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		<p>威摩劉 [redacted] 3/13</p>			營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		<p>蘇蘇 [redacted] 執行長 [redacted] 114.3.13</p>

備註：

1. 本表由營造單位填寫，依據保育措施推動期程自主檢查，並由主辦機關、主辦生態團隊、監造單位協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.3「生態異常狀況處理表(營造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。




W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
工程名稱				生態團隊			
				監造單位			
頭社頂社支線等圳強化工程 (金井巷支線)				營造單位			
				施工期程			
114年1月16日~114年7月14日 共179日				抽查日期			
114年04月21日				主辦機關負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		營造單位負責人 (單位/職稱)			
劉		威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)			
徐		台灣水資源與農業研究院/研究專員					
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區未發生野生動物投餵情形	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等,應妥善包裹,避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無民生廢棄物	






4	減輕	<p>施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置</p>	■	□	□	<p>工區內無野生動物受困或受傷</p>	
5	減輕	<p>工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於30以下。</p>	■	□	□	<p>工區內交通用具行駛時速皆低於30以下</p>	
6	減輕	<p>以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。</p>	■	□	□	<p>工區內以暨有農路做為施工便道及物料暫置區</p>	
7	減輕	<p>廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為</p>	■	□	□	<p>工區內無廢棄物任意棄置並集中堆放</p>	
8	減輕	<p>設置動物通道連接水陸域棲地</p>	□	□	■	<p>動物通道之坡面已施作，尚未拆模。</p>	

9	迴避	迴避火燒柯(一棵)(23°54'20.1"N 120°58'08.6"E)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商已有進行迴避	
10	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點, 避免晨昏施作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)				主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位			
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (金井巷支線)		施工工期		114年1月16日~114年7月14日 共179日		
			抽查日期		114年04月21日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不 合格	尚 未 執 行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區未發生野生動物投餵情形	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無民生廢棄物	

4	減輕	<p>施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內無野生動物受困或受傷</p>	
5	減輕	<p>工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內交通用具行駛時速皆低於 30 以下</p>	
6	減輕	<p>以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內以暨有農路做為施工便道及物料暫置區</p>	
7	減輕	<p>廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內無廢棄物任意棄置並集中堆放</p>	
8	減輕	<p>設置動物通道連接水陸域棲地</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>動物通道之坡面已施作，尚未拆模。</p>	

9	迴避	迴避火燒柯(一棵) (23°54'20.1"N 120°58'08.6"E)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商已有進行迴避	
10	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							


備註：


1. 本表由監造單位填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

表3-2 施工中生態保育措施抽查表(工區2)

W-4施工中生態保育措施自主檢查表(營造)					填寫單位	
					營造單位	
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區二-金井巷支線)			施工期程		114年1月16日~114年7月14日共 179日
				抽查日期		114年4月18日
項次	生態保育措施	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工前於工區內辦理生態教育訓練，包含野生動物保育及救援，並說明施工期間注意事項及保全標的。</p>  <p>教育訓練</p>  <p>保全對象指認</p>
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未見飼養或投餵流浪犬貓之行為，工區周邊未發現流浪犬貓徘徊之情形。</p>

						
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內及周邊未發現廚餘等民生廢棄物善落之情形。 
4	減輕	施工期間禁止工程相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工期間尚未發現類野生動物受困工區。
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程車輛行進時速限制於30公里以下。
6	減輕	以鄰近道路及農路做施工便道或臨時置料區使用，並以裸露地或草地等低敏感區域銜接至施作目標溝渠。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	使用既有草地及農地做施工便道使用。 
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未發現廢棄物任意棄置、焚燒及掩埋行為。






						 <p>施工區域整潔</p>  <p>工區周邊環境整潔</p>
8	減輕	於工程樁號0K+100至0K+105設置1處動物斜坡道，連結水陸域棲地。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>坡面已施作完畢但尚未拆模。</p> 
9	迴避	工程迴避既有大樹火燒柯1株。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>保全對象火燒柯於施工前以警示帶標示圍圍，施作過程均保持安全距離，檢視樹身、枝條皆無受損，循正常生長，未受擾動。</p>  <p>保全對象警示標示</p>


						
						保全對象循正常生理
10	迴避	工程施作限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程限制施工時間於早上8點至下午5點間，無夜間施工之情形。
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		威慶劉 [redacted] 4/18		營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		森霖 執行長 [redacted] 114.4.18

備註：

1. 本表由營造單位填寫，依據保育措施推動期程自主檢查，並由主辦機關、主辦生態團隊、監造單位協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.3「生態異常狀況處理表(營造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。




W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
工程名稱				生態團隊			
				監造單位			
頭社頂社支線等圳強化工程 (金井巷支線)				營造單位			
				施工期程			
114年1月16日~114年7月14日 共179日				抽查日期			
114年05月30日				主辦機關負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		營造單位負責人 (單位/職稱)			
劉		威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)			
徐		台灣水資源與農業研究院/研究專員					
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區未發生野生動物投餵情形	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等,應妥善包裹,避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無民生廢棄物	






4	減輕	<p>施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置</p>	■	□	□	<p>工區內無野生動物受困或受傷</p>	
5	減輕	<p>工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於30以下。</p>	■	□	□	<p>工區內交通用具行駛時速皆低於30以下</p>	
6	減輕	<p>以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。</p>	■	□	□	<p>工區內以暨有農路做為施工便道及物料暫置區</p>	
7	減輕	<p>廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為</p>	■	□	□	<p>工區內無廢棄物任意棄置並集中堆放</p>	
8	減輕	<p>設置動物通道連接水陸域棲地</p>	□	□	■	<p>動物通道之坡面已施作，尚未拆模。</p>	


9	迴避	迴避火燒柯(一棵)(23°54'20.1"N 120°58'08.6"E)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	保全喬木尚未受倒損傷	
10	迴避	工程施作應限於每日早上8點至下午5點, 避免晨昏施作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)				主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位			
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (金井巷支線)		施工工期		114年1月16日~114年7月14日 共179日		
			抽查日期		114年05月30日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不 合格	尚 未 執 行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區未發生野生動物投餵情形	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無民生廢棄物	

4	減輕	<p>施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置</p>	■	□	□	<p>工區內無野生動物受困或受傷</p>	
5	減輕	<p>工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。</p>	■	□	□	<p>工區內交通用具行駛時速皆低於 30 以下</p>	
6	減輕	<p>以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。</p>	■	□	□	<p>工區內以暨有農路做為施工便道及物料暫置區</p>	
7	減輕	<p>廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為</p>	■	□	□	<p>工區內無廢棄物任意棄置並集中堆放</p>	
8	減輕	<p>設置動物通道連接水陸域棲地</p>	□	□	■	<p>動物通道之坡面已施作，尚未拆模。</p>	




9	迴避	迴避火燒柯(一棵) (23°54'20.1"N 120°58'08.6"E)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	保全喬木尚未受 倒損傷	
10	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免 晨昏施作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 本表由**監造單位**填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

表3-2 施工中生態保育措施抽查表(工區2)

W-4施工中生態保育措施自主檢查表(營造)				填寫單位		
				營造單位		
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區二-金井巷支線)		施工期程			114年1月16日~114年7月14日共 179日
			抽查日期			114年5月07日
項次	生態保育措施	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工前於工區內辦理生態教育訓練，包含野生動物保育及救援，並說明施工期間注意事項及保全標的。</p>  <p>教育訓練</p>  <p>保全對象指認</p>
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未見飼養或投餵流浪犬貓之行為，工區周邊未發現流浪犬貓徘徊之情形。

						
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物覓食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內及周邊未發現廚餘等民生廢棄物善落之情形。 
4	減輕	施工期間禁止工程相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工期間尚未發現類野生動物受困工區。
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程車輛行進時速限制於30公里以下。
6	減輕	以鄰近道路及農路做施工便道或臨時置料區使用，並以裸露地或草地等低敏感區域銜接至施作目標溝渠。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	使用既有草地及農地做施工便道使用。 
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未發現廢棄物任意棄置、焚燒及掩埋行為。





						 <p>施工區域整潔</p>  <p>工區周邊環境整潔</p>
8	減輕	於工程樁號0K+100至0K+105設置1處動物斜坡道，連結水陸域棲地。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>動物斜坡道已施作完畢。</p> 
9	迴避	工程迴避既有大樹-火燒柯1株。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>保全對象火燒柯於施工前以警示帶標示圍圍，施作過程均保持安全距離，檢視樹身、枝條皆無受損，循正常生長，未受擾動。</p>  <p>保全對象警示標示</p>


						
						保全對象循正常生理
10	迴避	工程施作限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程限制施工時間於早上8點至下午5點間，無夜間施工之情形。
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		威慶劉 [redacted] 5/11		營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		蘇翽 執行長 珠 [redacted] 14.5.7

備註：

1. 本表由營造單位填寫，依據保育措施推動期程自主檢查，並由主辦機關、主辦生態團隊、監造單位協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.3「生態異常狀況處理表(營造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。


W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
工程名稱				生態團隊			
				監造單位			
頭社頂社支線等圳強化工程 (金井巷支線)				營造單位			
				施工期程			
114年1月16日~114年7月14日 共179日				抽查日期			
114年08月06日(完工抽查)				主辦機關負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		營造單位負責人 (單位/職稱)			
劉		威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)			
徐		台灣水資源與農業研究院/研究專員					
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後未發現野生動物逗留	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄物如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後現場無民生廢棄物	


4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	■	□	□	完工後無野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	■	□	□	完工後相關交通用具已撤場	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	■	□	□	完工後施工便道恢復良好	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	■	□	□	完工後無廢棄物遺留	
8	減輕	設置動物通道連接水陸域棲地	□	□	■	動物通道之坡面已施作完成，並架設爬網。	

9	迴避	迴避火燒柯(一棵) (23°54'20.1"N 120°58'08.6"E)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後生長狀況良好	
10	迴避	工程施作應限於每日 早上 8 點至下午 5 點， 避免晨昏施作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)				主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位			
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (金井巷支線)		施工工期		114年1月16日~114年7月14日 共179日		
			抽查日期		114年08月06日(完工抽查)		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態保 育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不 合格	尚 未 執 行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後未發現野生動物逗留	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後現場無民生廢棄物	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後無野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於30以下。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後相關交通用具已撤場	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後施工便道恢復良好	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後無廢棄物遺留	
8	減輕	設置動物通道連接水陸域棲地	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	動物通道之坡面已施作完成，並架設爬網。	
9	迴避	迴避火燒柯(一棵)(23°54'20.1"N 120°58'08.6"E)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後生長狀況良好	




10	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作
(欄位請自行新增)						

備註：







1. 本表由**監造單位**填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

表3-2 施工中生態保育措施抽查表(工區2)

W-4 施工中生態保育措施自主檢查表(營造)					填寫單位	
					營造單位	
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區二-金井巷支線)			施工期程		114年1月16日~114年7月14日共 179日
				抽查日期		114年6月11日
項次	生態保育措施	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工前於工區內辦理生態教育訓練，包含野生動物保育及救援，並說明施工期間注意事項及保全標的。</p>  <p>教育訓練</p>  <p>保全對象指認</p>
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未見飼養或投餵流浪犬貓之行為，工區周邊未發現流浪犬貓徘徊之情形。

						
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內及周邊未發現廚餘等民生廢棄物善落之情形。 
4	減輕	施工期間禁止工程相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工期間尚未發現野生動物受困工區。
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施作期間工程車輛行進時速限制於30公里以下，並無路殺事件記錄，完工後相關車輛及人員已撤場。
6	減輕	以鄰近道路及農路做施工便道或臨時置料區使用，並以裸露地或草地等低敏感區域銜接至施作目標溝渠。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	使用既有草地及農地做施工便道使用，完工後已無車輛進出，草本植被逐漸拓殖生長覆蓋便道。 
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未發現廢棄物任意棄置、焚燒及掩埋行為。






						 <p>施工區域整潔</p>  <p>工區周邊環境整潔</p>
8	減輕	於工程格號OK-100至OK-105設置1處動物斜坡道，連結水陸域棲地。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>動物斜坡道已施作完畢並增設2處簡易動物通道，利於野生動物離開渠道不致受困。</p>  <p>共構動物斜坡道</p>  <p>竹構簡易動物通道</p>


						 <p>動物攀爬網及木構橫越道</p>
9	迴避	工程迴避既有大樹-火燒柯1株。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>保全對象火燒柯於施工前以警示帶標示圍圍，施作過程均保持安全距離，完工後相關警示帶已撤除，檢視樹身、枝條皆無受損，循正常生長未受擾動。</p>  <p>保全對象警示標示已撤除</p>  <p>保全對象循正常生理</p>
10	迴避	工程施作限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工程施作期間皆確實限制施工時間於早上8點至下午5點間，無夜間施工之情形。</p>
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)					營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)	
						

備註：

1. 本表由營造單位填寫，依據保育措施推動期程自主檢查，並由主辦機關、主辦生態團隊、監造單位協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
工程名稱				生態團隊			
				監造單位			
頭社頂社支線等圳強化工程 (新城圳第二支線)				營造單位			
				施工期程			
114年1月16日~114年7月14日 共179日				抽查日期			
114年01月22日				主辦機關負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		營造單位負責人 (單位/職稱)			
劉		威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)			
徐		台灣水資源與農業研究院/研究專員					
項次	生態保育措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	於施工教育訓練中，與工地負責人進行說明。	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	與主辦機關討論屆時廢棄物暫置區域。	






4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	與規劃階段生態團隊討論詩作起訖點之位置。	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	尚未施工	
8	減輕	設置單邊緩坡渠道維持既有廊道，或掛網改善渠道通行	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	本團隊針對掛網設置位置進行勘查。	


9	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	■	□	□	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
---	----	-------------------------------	---	---	---	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)					主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位		
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (新城圳第二支線)		施工期程		114年1月16日~114年7月14日 共179日		
			抽查日期		114年01月22日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作站 /副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	於施工教育訓練中，與工地負責人進行說明。	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	與主辦機關討論屆時廢棄物暫置區域。	

4	減輕	<p>施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
5	減輕	<p>工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
6	減輕	<p>以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>與規劃階段生態團隊討論詩作起訖點之位置。</p>	
7	減輕	<p>廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
8	減輕	<p>設置單邊緩坡渠道維持既有廊道，或掛網改善渠道通行</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>本團隊針對掛網設置位置進行勘查。</p>	

9	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨 昏施作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	已與施工廠商 進行教育訓練	
---	----	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

備註：

1. 本表由監造單位填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

表3-3 施工中生態保育措施抽查表(工區3)

W-4施工中生態保育措施自主檢查表(營造)					填寫單位	
					營造單位	
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區三-新城圳第二支線)			施工期程		114年1月16日~114年7月14日共 179日
				抽查日期		114年2月24日
項次	生態保育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
4	減輕	施工期間禁止工程相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。

5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
6	減輕	以鄰近道路及農路做施工便道或臨時置料區使用，並以裸露地或草地等低敏感區域銜接至施作目標溝渠。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
8	減輕	設置單邊緩坡或渠道維持既有廊道，或掛網改善渠道通行。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
9	迴避	工程施作限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		威慶劉 [redacted] 2/24	營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		森霖 執行長 陳 [redacted] 114.2.29	

備註：

1. 本表由營造單位填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合合格事項，應接續填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

表3-3 施工中生態保育措施抽查表(工區3)

W-4施工中生態保育措施自主檢查表(營造)					填寫單位	
					營造單位	
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區三-新城圳第二支線)			施工期程		114年1月16日~114年7月14日共 179日
				抽查日期		
項次	生態保育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
4	減輕	施工期間禁止工程相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。

3	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
6	減輕	以鄰近道路及農路做施工便道或臨時置料區使用，並以裸露地或草地等低敏感區域銜接至施作目標溝渠。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
8	減輕	設置單邊緩坡或渠道維持既有廊道，或掛網改善渠道通行。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
9	迴避	工程施作限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		威慶劉 [redacted] 3/13	營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		壽崧執行長 [redacted] 114.3.13	

備註：

1. 本表由營造單位填寫，依據保育措施推動期程自主檢查，並由主辦機關、主辦生態團隊、監造單位協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合合格事項，應填寫施工階段W-5.3「生態異常狀況處理表(營造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

表3-3 施工中生態保育措施抽查表(工區3)






W-4施工中生態保育措施自主檢查表(營造)					填寫單位	
					營造單位	
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區三-新城圳第二支線)			施工期程	114年1月16日~114年7月14日共 179日	
				抽查日期	114年4月18日	
項次	生態保育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
4	減輕	施工期間禁止工程相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。

5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
6	減輕	以鄰近道路及農路做施工便道或臨時置料區使用，並以裸露地或草生地等低敏感區域銜接至施作目標溝渠。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
8	減輕	設置單邊緩坡或渠道維持既有廊道，或掛網改善渠道通行。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
9	迴避	工程施作限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		威慶 劉 [redacted] 4/18	營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		蘇堯化 執行長 陳 [redacted] 114.4.18	

備註：

1. 本表由營造單位填寫，依據保育措施推動期程自主檢查，並由主辦機關、主辦生態團隊、監造單位協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.3「生態異常狀況處理表(營造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
工程名稱				生態團隊			
				監造單位			
頭社頂社支線等圳強化工程 (新城圳第二支線)				營造單位			
				施工期程			
114年1月16日~114年7月14日 共179日				抽查日期			
114年05月20日				主辦機關負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		營造單位負責人 (單位/職稱)			
劉		威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)			
徐		台灣水資源與農業研究院/研究專員					
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未發現野生犬貓	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無民生廢棄物	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未有野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內相關交通用具行進時速皆低於 30 以下	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商確實以鄰近道路做為施工便道及物料暫置區	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無廢棄物任意棄置	
8	減輕	設置單邊緩坡渠道維持既有廊道，或掛網改善渠道通行	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商確實設置單邊緩坡渠道維持既有廊道	

9	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	■	□	□	工程施作確實避免晨昏施作
(欄位請自行新增)						

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)					主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位		
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (新城圳第二支線)			施工期程		114年1月16日~114年7月14日 共179日	
				抽查日期		114年05月20日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作站 /副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未 執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未發現野生犬貓	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無民生廢棄物	

4	減輕	<p>施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未有野生動物受困或受傷</p>	
5	減輕	<p>工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內相關交通用具行進時速皆低於 30 以下</p>	
6	減輕	<p>以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>營造廠商確實以鄰近道路做為施工便道及物料暫置區</p>	
7	減輕	<p>廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內無廢棄物任意棄置</p>	
8	減輕	<p>設置單邊緩坡渠道維持既有廊道，或掛網改善渠道通行</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>營造廠商確實設置單邊緩坡渠道維持既有廊道</p>	

9	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨 昏施作	■	□	□	工程施作確實避免晨昏施作
---	----	--------------------------------------	---	---	---	--------------

備註：

1. 本表由**監造單位**填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

表3-3 施工中生態保育措施抽查表(工區3)






W-4施工中生態保育措施自主檢查表(營造)					填寫單位	
					營造單位	
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區三-新城圳第二支線)			施工期程	114年1月16日~114年7月14日共 179日	
				抽查日期	114年5月07日	
項次	生態保育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。
4	減輕	施工期間禁止工程相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。

5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。	
6	減輕	以鄰近道路及農路做施工便道或臨時置料區使用，並以裸露地或草地等低敏感區域銜接至施作目標溝渠。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。	
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。	
8	減輕	設置單邊緩坡或渠道維持既有廊道，或掛網改善渠道通行。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。	
9	迴避	工程施作限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	本工區尚未進場施作。	
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		威慶 劉 [redacted] 5/9			營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		森副 執行長 陳 [redacted] 114.5.9

備註：

1. 本表由營造單位填寫，依據保育措施推動期程自主檢查，並由主辦機關、主辦生態團隊、監造單位協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整。
3. 如抽查有不合事項，應填寫施工階段W-5.3「生態異常狀況處理表(營造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
工程名稱				生態團隊			
				監造單位			
頭社頂社支線等圳強化工程 (新城圳第二支線)				營造單位			
				施工期程			
114年1月16日~114年7月14日 共179日				抽查日期			
114年06月13日				主辦機關負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		營造單位負責人 (單位/職稱)			
劉		威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)			
徐		台灣水資源與農業研究院/研究專員					
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未發現野生犬貓	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無民生廢棄物	






4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未有野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內相關交通用具行進時速皆低於 30 以下	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商確實以鄰近道路做為施工便道及物料暫置區	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無廢棄物任意棄置	
8	減輕	設置單邊緩坡渠道維持既有廊道，或掛網改善渠道通行	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商確實設置單邊緩坡渠道維持既有廊道	

9	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	■	□	□	工程施作確實避免晨昏施作
(欄位請自行新增)						

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)					主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位		
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (新城圳第二支線)			施工期程		114年1月16日~114年7月14日 共179日	
				抽查日期		114年06月13日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作站 /副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未 執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未發現野生犬貓	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無民生廢棄物	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未有野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內相關交通用具行進時速皆低於 30 以下	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商確實以鄰近道路做為施工便道及物料暫置區	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無廢棄物任意棄置	
8	減輕	設置單邊緩坡渠道維持既有廊道，或掛網改善渠道通行	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商確實設置單邊緩坡渠道維持既有廊道	

9	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨 昏施作	■	□	□	工程施作確實避免晨昏施作
(欄位請自行新增)						



備註：

1. 本表由**監造單位**填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

表3-3 施工中生態保育措施抽查表(工區3)


W-4施工中生態保育措施自主檢查表(營造)					填寫單位	
					營造單位	
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區三-新城圳第二支線)			施工期程	114年1月16日~114年7月14日共 179日	
				抽查日期	114年6月11日	
項次	生態保育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工前於工區內辦理生態教育訓練，包含野生動物保育及救援，並說明施工期間注意事項及保全標的。</p> 
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未見飼養或投餵流浪犬貓之行為，工區周邊未發現流浪犬貓徘徊之情形。</p>
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內及周邊未發現廚餘等民生廢棄物善落之情形。</p> 





4	減輕	<p>施工期間禁止工程相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工期間尚未發現類野生動物受困工區。</p> 
5	減輕	<p>工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>確實依速限行進，工區出入口動線無記錄動物路殺個體。</p>
6	減輕	<p>以鄰近道路及農路做施工便道或臨時置料區使用，並以裸露地或草地等低敏感區域銜接至施作目標溝渠。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>使用既有草地及農地做施工便道使用，臨溪以左岸灘地為便道。</p>  <p>以草地及裸露地為施工便道</p>  <p>以草地暫置物料</p>
7	減輕	<p>工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未發現廢棄物任意棄置、焚燒及掩埋行為。</p>

8	減輕	設置單邊緩坡或渠道維持既有廊道，或掛網改善渠道通行。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施作相關設施。
9	迴避	工程施作限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程限制施工時間於早上8點至下午5點間，無夜間施工之情形。
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)					營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期) 	

備註：

1. 本表由營造單位填寫，依據保育措施推動期程自主檢查，並由主辦機關、主辦生態團隊、監造單位協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.3「生態異常狀況處理表(營造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。





W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
工程名稱				生態團隊			
				監造單位			
頭社頂社支線等圳強化工程 (新城圳第二支線)				營造單位			
				施工期程			
114年1月16日~114年7月14日 共179日				抽查日期			
114年08月06日(完工抽查)				主辦機關負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		營造單位負責人 (單位/職稱)			
劉		威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)			
徐		台灣水資源與農業研究院/研究專員					
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後未發現野生犬貓	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後無民生廢棄物	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後未有野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後相關交通用具皆已撤場	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後鄰近道路已復原	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後無廢棄物任意棄置	
8	減輕	設置單邊緩坡渠道維持既有廊道，或掛網改善渠道通行	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後確實設置掛網改善渠道通行	
9	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。



W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)					主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位		
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (新城圳第二支線)		施工期程		114年1月16日~114年7月14日 共179日		
			抽查日期		114年08月06日(完工抽查)		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作站 /副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未 執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後未發現野生犬貓	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後無民生廢棄物	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後未有野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後相關交通用具皆已撤場	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後鄰近道路已復原	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後無廢棄物任意棄置	
8	減輕	設置單邊緩坡渠道維持既有廊道，或掛網改善渠道通行	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後確實設置掛網改善渠道通行	
9	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 本表由**監造單位**填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

表3-3 施工中生態保育措施抽查表(工區3)

W-4施工中生態保育措施自主檢查表(營造)				填寫單位		
				營造單位		
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區三-新城圳第二支線)		施工期程		114年1月16日~114年7月14日共 179日	
			抽查日期		114年7月15日	
項次	生態保育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工前於工區內辦理生態教育訓練，包含野生動物保育及救援，並說明施工期間注意事項及保全標的。</p> 
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未見飼養或投餵流浪犬貓之行為，工區周邊未發現流浪犬貓徘徊之情形。</p> 
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內及周邊未發現廚餘等民生廢棄物善落之情形，環境整潔乾淨。</p>

						
4	減輕	施工期間禁止工程相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工期間無野生動物受困於工區。</p> 
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工期間確實依速限行進，工區出入口動線無記錄動物路殺個體。</p>
6	減輕	以鄰近道路及農路做施工便道或臨時置料區使用，並以裸露地或草生地等低敏感區域銜接至施作目標溝渠。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>使用既有草生地及農地做施工便道使用，完工後鋼板便道已復原，農地已種植香蕉等作物，相關暫置區已撤除並復原環境。</p>  <p>以草生地及裸露地為施工便道</p>




						 <p>物料暫置區已撤除</p>
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未發現廢棄物任意棄置、焚燒及掩埋行為，工區整潔乾淨。</p> 
8	減輕	設置單邊緩坡或渠道維持既有廊道，或掛網改善渠道通行。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>渠道內設有簡易攀爬網，且渠道集水井底部子農田相連，動物可自由通行渠道及周邊農地。</p>  <p>簡易攀爬網</p>  <p>渠道集水井無阻隔</p>

9	迴避	工程施作限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作期間確實限制施工時間於早上8點至下午5點間，且無夜間施工之情形。
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		威慶 劉 [redacted] 11/14			營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)	
		蘇義 執行長 孫 [redacted] 11/14				

備註：

1. 本表由營造單位填寫，依據保育措施推動期程自主檢查，並由主辦機關、主辦生態團隊、監造單位協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.3「生態異常狀況處理表(營造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。




W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)					主辦機關		
					設計單位		
工程名稱					生態團隊		
					監造單位		
頭社頂社支線等圳強化工程 (高羽圳支線)					營造單位		
					施工期程		
114年1月16日~114年7月14日 共179日					抽查日期		
114年01月22日					主辦機關負責人 (單位/職稱)		
李■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師					監造單位負責人 (單位/職稱)		
李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師					營造單位負責人 (單位/職稱)		
劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人					生態人員 (單位/職稱)		
徐■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員					生態 保育 措施		
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	於施工教育訓練進行說明	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	

5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	已與施作廠商進行教育訓練	
8	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)				主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位			
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (高羽圳支線)		施工期程			114年1月16日~114年7月14日 共179日	
			抽查日期			114年01月22日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未 執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	於施工教育訓練進行說明	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	

5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於30以下。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	已與施作廠商進行教育訓練	
8	迴避	工程施作應限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 本表由監造單位填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。




W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)					主辦機關		
					設計單位		
工程名稱					生態團隊		
					監造單位		
頭社頂社支線等圳強化工程 (高羽圳支線)					營造單位		
					施工期程		
114年1月16日~114年7月14日 共179日					抽查日期		
114年02月21日					主辦機關負責人 (單位/職稱)		
李■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師					監造單位負責人 (單位/職稱)		
李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師					營造單位負責人 (單位/職稱)		
劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人					生態人員 (單位/職稱)		
徐■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員							
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	於施工教育訓練進行說明	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	

5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	已與施作廠商進行教育訓練	
8	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)						主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位	
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (高羽圳支線)		施工期程			114年1月16日~114年7月14日 共179日	
			抽查日期			114年02月21日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	於施工教育訓練進行說明	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	

5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於30以下。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	尚未施工	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	已與施作廠商進行教育訓練	
8	迴避	工程施作應限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 本表由**監造單位**填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

表3-4 施工中生態保育措施抽查表(工區4)

W-4施工中生態保育措施自主檢查表(營造)			填寫單位			
			營造單位			
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區四-高羽圳支線)		施工期程			114年1月16日~114年7月14日共 179日
			抽查日期			114年2月24日
項次	生態保育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工前於工區內辦理生態教育訓練，包含野生動物保育及救援，並說明施工期間注意事項及保全標的。</p> 
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未見飼養或投餵流浪犬貓之行為，工區周邊未發現流浪犬貓徘徊之情形。</p> 
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內及周邊未發現廚餘等民生廢棄物散落之情形。</p>

\*生態營造廠商於 114 年 2 月起協助抽查

						
4	減輕	施工期間禁止工程相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工期間尚未發現野生動物受困工區。
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程車輛行進時速限制於30公里以下。
6	減輕	以鄰近道路及農路做施工便道或臨時置料區使用，並以裸露地或草地等低敏感區域銜接呈施作目標溝渠。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	使用既有草地及農地做施工便道使用， 
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未發現廢棄物任意棄置、焚燒及掩埋行為。 

8	迴避	工程施作限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程限制施工時間於早上8點至下午5點間，無夜間施工之情形。
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		威慶 劉 [redacted] 2/24	營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		森霖 執行長 陳 [redacted] 114/3/24	

備

註：

1. 本表由**營造單位**填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應接續填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
工程名稱				生態團隊			
				監造單位			
頭社頂社支線等圳強化工程 (高羽圳支線)				營造單位			
				施工期程			
114年1月16日~114年7月14日 共179日				抽查日期			
114年03月10日				主辦機關負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師		營造單位負責人 (單位/職稱)			
劉		威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)			
徐		台灣水資源與農業研究院/研究專員					
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未發現野生犬貓	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無民生廢棄物	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未有野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內相關交通用具行進時速皆低於 30 以下	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商確實以鄰近道路做為施工便道及物料暫置區	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無廢棄物任意棄置	
8	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)					主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位		
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (高羽圳支線)		施工期程		114年1月16日~114年7月14日 共179日		
			抽查日期		114年03月10日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	工區內未發現野生犬貓	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	工區內無民生廢棄物	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	工區內未有野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於30以下。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	工區內相關交通用具行進時速皆低於30以下	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	營造廠商確實以鄰近道路做為施工便道及物料暫置區	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	工區內無廢棄物任意棄置	
8	迴避	工程施作應限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 本表由**監造單位**填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

表3-4 施工中生態保育措施抽查表(工區4)

W-4施工中生態保育措施自主檢查表(營造)					填寫單位	
					營造單位	
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區四-高羽圳支線)			施工期程	114年1月16日~114年7月14日共 179日	
				抽查日期	114年3月13日	
項次	生態保育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工前於工區內辦理生態教育訓練，包含野生動物保育及救援，並說明施工期間注意事項及保全標的。</p> 
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未見飼養或投餵流浪犬貓之行為，工區周邊未發現流浪犬貓徘徊之情形。</p> 
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內及周邊未發現廚餘等民生廢棄物散落之情形。</p>




						
4	減輕	施工期間禁止工程相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物。若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工期間尚未發現類野生動物受困工區。</p> 
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工程車輛行進時速限制於30公里以下。</p> 
6	減輕	以鄰近道路及農路做施工便道或臨時置料區使用，並以裸露地或草地等低敏感區域銜接至施作目標溝渠。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>依用既有草地及農地做施工便道使用。</p> 
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未發現廢棄物任意棄置、焚燒及掩埋行為。</p>

8	迴避	工程施作限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程限制施工時間於早上8點至下午5點間，無夜間施工之情形。
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		威慶 劉 [redacted] 3/13	營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)		森 [redacted] 執行 [redacted] 114.3.13	

備註：

1. 本表由營造單位填寫，依據保育措施推動期程自主檢查，並由主辦機關、主辦生態團隊、監造單位協助確認。
2. 抽查次數及抽查順序得視工程實際執行情形調整。
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.3「生態異常狀況處理表(營造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。





W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
工程名稱				生態團隊			
				監造單位			
頭社頂社支線等圳強化工程 (高羽圳支線)				營造單位			
				施工期程			
114年1月16日~114年7月14日 共179日				抽查日期			
114年04月21日				主辦機關負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師		營造單位負責人 (單位/職稱)			
劉		威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)			
徐		台灣水資源與農業研究院/研究專員					
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未發現野生犬貓	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無民生廢棄物	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未有野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內相關交通用具行進時速皆低於 30 以下	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商確實以鄰近道路做為施工便道及物料暫置區	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無廢棄物任意棄置	
8	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由生態團隊填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由主辦機關填寫，並可視需求邀請生態團隊協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)					主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位		
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (高羽圳支線)			施工期程		114年1月16日~114年7月14日 共179日	
				抽查日期		114年04月21日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師			監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人			生態人員 (單位/職稱)		徐■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未發現野生犬貓	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無民生廢棄物	




4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未有野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於30以下。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內相關交通用具行進時速皆低於30以下	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商確實以鄰近道路做為施工便道及物料暫置區	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無廢棄物任意棄置	
8	迴避	工程施作應限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 本表由**監造單位**填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

表3-4 施工中生態保育措施抽查表(工區4)




W-4施工中生態保育措施自主檢查表(營造)					填寫單位	
					營造單位	
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區四-高羽圳支線)			施工期程	114年1月16日~114年7月14日共 179日	
				抽查日期	114年4月18日	
項次	生態保育措施	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工前於工區內辦理生態教育訓練，包含野生動物保育及救援，並說明施工期間注意事項及保全標的。</p> 
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未見飼養或投餵流浪犬貓之行為，工區周邊未發現流浪犬貓徘徊之情形。</p> 
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內及周邊未發現廚餘等民生廢棄物善落之情形。</p> 





4	減輕	<p>施工期間禁止工程相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工期間尚未發現類野生動物受困工區。</p> 
5	減輕	<p>工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工程車輛行進時速限制於30公里以下。</p> 
6	減輕	<p>以鄰近道路及農路做施工便道或臨時置料區使用，並以裸露地或草地等低敏感區域銜接至施作目標溝渠。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>使用既有草地及農地做施工便道使用，臨溪以左岸灘地為便道。</p>  <p>既有農路便道</p>  <p>左岸灘地便道</p>
7	減輕	<p>工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未發現廢棄物任意棄置、焚燒及掩埋行為。</p>

		及掩埋行為。				
8	迴避	工程施作限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程限制施工時間於早上8點至下午5點間，無夜間施工之情形。
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		咸慶 劉 [redacted] 4/18			營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)	
					森凱 執行長 [redacted] 14.4.18	

備註：




1. 本表由營造單位填寫，依據保育措施推動期程自主檢查，並由主辦機關、主辦生態團隊、監造單位協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整。
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.3「生態異常狀況處理表(營造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。





W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
工程名稱				生態團隊			
				監造單位			
頭社頂社支線等圳強化工程 (高羽圳支線)				營造單位			
				施工期程			
114年1月16日~114年7月14日 共179日				抽查日期			
114年05月20日				主辦機關負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作站/副工程師		營造單位負責人 (單位/職稱)			
劉		威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)			
徐		台灣水資源與農業研究院/研究專員					
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未發現野生犬貓	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無民生廢棄物	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未有野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內相關交通用具行進時速皆低於 30 以下	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商確實以鄰近道路做為施工便道	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無廢棄物任意棄置	
8	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)					主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位		
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (高羽圳支線)		施工期程		114年1月16日~114年7月14日 共179日		
			抽查日期		114年05月20日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作站 /副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未 執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未發現野生犬貓	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無民生廢棄物	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未有野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內相關交通用具行進時速皆低於 30 以下	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商確實以鄰近道路做為施工便道	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無廢棄物任意棄置	
8	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							







備註：

1. 本表由**監造單位**填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

表3-4 施工中生態保育措施抽查表(工區4)


W-4施工中生態保育措施自主檢查表(營造)					填寫單位	
					營造單位	
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區四-高羽圳支線)			施工工期		114年1月16日~114年7月14日共 179日
				抽查日期		114年5月07日
項次	生態保育措施	措施抽查項目	抽查結果			社查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工前於工區內辦理生態教育訓練，包含野生動物保育及救援，並說明施工期間注意事項及保全標的。</p> 
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未見飼養或投餵流浪犬貓之行為，工區周邊未發現流浪犬貓徘徊之情形。</p> 
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內及周邊未發現廚餘等民生廢棄物善落之情形。</p> 





4	減輕	施工期間禁止工程相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工期間尚未發現類野生動物受困工區。</p> 
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工程車輛行進時速限制於30公里以下。</p> 
6	減輕	以鄰近道路及農路做為施工便道或臨時置料區使用，並以裸露地或草地等低敏感區域銜接至施作目標溝渠。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>使用既有草地及農地做施工便道使用，臨溪以左岸灘地為便道。</p>  <p>既有農路便道</p>  <p>左岸灘地便道</p>
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未發現廢棄物任意棄置、焚燒及掩埋行為。</p>

		行為。				
8	迴避	工程施作限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程限制施工時間於早上8點至下午5點間，無夜間施工之情形。
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		  5/17			營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)	
					    114.57	

備註：




1. 本表由營造單位填寫，依據保育措施推動期程自主檢查，並由主辦機關、主辦生態團隊、監造單位協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.3「生態異常狀況處理表(營造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
工程名稱				生態團隊			
				監造單位			
頭社頂社支線等圳強化工程 (高羽圳支線)				營造單位			
				施工期程			
114年1月16日~114年7月14日 共179日				抽查日期			
114年06月13日				主辦機關負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師		營造單位負責人 (單位/職稱)			
劉		威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)			
徐		台灣水資源與農業研究院/研究專員					
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未發現野生犬貓	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無民生廢棄物	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未有野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內相關交通用具行進時速皆低於 30 以下	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商確實以鄰近道路做為施工便道及物料暫置區	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無廢棄物任意棄置	
8	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)					主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位		
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (高羽圳支線)		施工期程		114年1月16日~114年7月14日 共179日		
			抽查日期		114年06月13日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未發現野生犬貓	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無民生廢棄物	




4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未有野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於30以下。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內相關交通工具行進時速皆低於30以下	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商確實以鄰近道路做為施工便道及物料暫置區	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無廢棄物任意棄置	
8	迴避	工程施作應限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 本表由**監造單位**填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

表3-4 施工中生態保育措施抽查表(工區4)




W-4 施工中生態保育措施自主檢查表(營造)					填寫單位	
					營造單位	
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區四-高羽圳支線)			施工期程		114年1月16日~114年7月14日共 179日
				抽查日期		114年6月11日
項次	生態保育措施	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工前於工區內辦理生態教育訓練，包含野生動物保育及救援，並說明施工期間注意事項及保全標的。</p> 
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵流浪犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未見飼養或投餵流浪犬貓之行為，工區周邊未發現流浪犬貓徘徊之情形。</p> 
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內及周邊未發現廚餘等民生廢棄物善落之情形。</p> 


4	減輕	<p>施工期間禁止工程相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工期間尚未發現野生動物受困工區。</p> 
5	減輕	<p>工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工程車輛行進時速限制於30公里以下。</p> 
6	減輕	<p>以鄰近道路及農路做施工便道或臨時置料區使用，並以裸露地或草生地等低敏感區域銜接至施作目標溝渠。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>使用既有草生地及農地做施工便道使用，臨溪以左岸灘地為便道。</p>  <p>既有農路便道</p>  <p>左岸灘地便道</p>
7	減輕	<p>工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未發現廢棄物任意棄置、焚燒及掩埋行為。</p>

		行為。				
S	迴避	工程施作限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程限制施工時間於早上8點至下午5點間，無夜間施工之情形。
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		  			營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)	
		  				

備註：

1. 本表由營造單位填寫，依據保育措施推動期程自主檢查，並由主辦機關、主辦生態團隊、監造單位協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.3「生態異常狀況處理表(營造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。

W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)					主辦機關		
					設計單位		
工程名稱					生態團隊		
					監造單位		
頭社頂社支線等圳強化工程 (高羽圳支線)					營造單位		
					施工期程		
114年1月16日~114年7月14日 共179日					抽查日期		
114年08月06日(完工抽查)					主辦機關負責人 (單位/職稱)		
李■■■■ 農田水利署南投管理處魚池工 作站/副工程師					監造單位負責人 (單位/職稱)		
李■■■■ 農田水利署南投管理處魚池工 作站/副工程師					營造單位負責人 (單位/職稱)		
劉■■■■ 威慶營造有限公司/負責人					生態人員 (單位/職稱)		
徐■■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員							
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後未發現野生犬貓	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後無民生廢棄物	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後未有野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後相關交通用具皆已撤場	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後鄰近道路已復原	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後無廢棄物任意棄置	
8	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)				主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位			
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (高羽圳支線)		施工期程		114年1月16日~114年7月14日 共179日		
			抽查日期		114年08月06日(完工抽查)		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作站 /副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未 執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後未發現野生犬貓	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後無民生廢棄物	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後未有野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後相關交通用具皆已撤場	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後鄰近道路已復原	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後無廢棄物任意棄置	
8	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							




備註：

1. 本表由監造單位填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

表3-4 施工中生態保育措施抽查表(工區4)

W-4施工中生態保育措施自主檢查表(營造)					填寫單位	
					營造單位	
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區四-高羽圳支線)			施工期程	114年1月16日~114年7月14日共 179日	
				抽查日期	114年7月15日	
項次	生態保育措施	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工前於工區內辦理生態教育訓練，包含野生動物保育及救援，並說明施工期間注意事項及保全標的。</p> 
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未見飼養或投餵流浪犬貓之行為，工區周邊未發現流浪犬貓徘徊之情形。</p> 
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下班帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內及周邊未發現廚餘等民生廢棄物散落之情形。</p> 


4	減輕	<p>施工期間禁止工程相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工期間均無發現野生動物受困工區。</p> 
5	減輕	<p>工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>完工後相關機具及人員已撤除，檢視工區內及周邊無野生動物路殺紀錄。</p> 
6	減輕	<p>以鄰近道路及農路做施工便道或臨時置料區使用，並以裸露地或草生地等低敏感區域銜接至施作目標溝渠。</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>使用既有草生地及農地做施工便道使用，臨溪以左岸灘地為便道，完工後灘地便道已復原，工區內已無臨時置料區。</p>  <p>既有農路便道</p>  <p>左岸灘地便道已復原</p>

7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未發現廢棄物任意棄置、焚燒及掩埋行為，環境整潔。
8	迴避	工程施工限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工過程均確實限制施工時間於早上8點至下午5點間，且無夜間施工之情形。
營造單位 單位/職稱 (簽名+日期)		 7/14			營造生態人員 單位/職稱 (簽名+日期)	
					 執行長  114/7/14	

備註：

1. 本表由營造單位填寫，依據保育措施推動期程自主檢查，並由主辦機關、主辦生態團隊、監造單位協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合合格事項，應填寫施工階段W-5.3「生態異常狀況處理表(營造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。




W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
				生態團隊			
				營造單位			
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (頭社頂社支線)		施工期程		114年1月16日~114年7月14日 共179日		
			抽查日期		114年01月22日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未發現野生犬貓	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無民生廢棄物	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內相關交通用具行進時速皆為 30 以下	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商確實以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無任意棄置廢棄物	
8	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。






W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)				主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位			
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (頭社頂社支線)		施工期程		114年1月16日~114年7月14日 共179日		
			抽查日期		114年01月22日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於施工前召集廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內未發現野生犬貓	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無民生廢棄物	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內相關交通用具行進時速皆為 30 以下	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商確實以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工區內無任意棄置廢棄物	
8	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作確實避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 本表由監造單位填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。


W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)					主辦機關		
					設計單位		
工程名稱					生態團隊		
					監造單位		
頭社頂社支線等圳強化工程 (頭社頂社支線)					營造單位		
					營造單位		
工程名稱		頭社頂社支線等圳強化工程 (頭社頂社支線)		施工期程		114年1月16日~114年7月14日 共179日	
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工初期召集承辦人員、廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商未投餵野生犬貓	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商皆有妥善處理	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無發現野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商相關交通工具皆低於限速 30 以下	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商皆有以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商皆有妥善集中進行堆放作業	
8	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商將持續依措施進行工程施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由生態團隊填寫，並由主辦機關協助確認。

2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)				主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位			
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (頭社頂社支線)		施工期程		114年1月16日~114年7月14日 共179日		
			抽查日期		114年02月10日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工初期召集承辦人員、廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商未投餵野生犬貓	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商皆有妥善處理	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無發現野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商相關交通工具皆低於限速 30 以下	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商皆有以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商皆有妥善集中進行堆放作業	
8	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	營造廠商將持續依措施進行工程施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 本表由監造單位填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。

2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

表3-4 施工中生態保育措施抽查表(工區6)


W-4施工中生態保育措施自主檢查表(營造)					填寫單位	
					營造單位	
工程名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (工區六-頭社頂社支線)			施工期程		114年1月16日~114年7月14日共 179日
				抽查日期		114年2月24日
項次	生態保育策略	措施抽查項目	抽查結果			抽查情形說明
			合格	不合格	尚未執行	
1	減輕	施工前針對相關人員實施生態教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工前於工區內辦理生態教育訓練，包含野生動物保育及救援，並說明施工期間注意事項及保全標的。</p> 
2	減輕	工程施作禁止飼養或投餵犬貓，避免加重工區周邊流浪犬貓對於野生動物之獵捕壓力。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未見飼養或投餵流浪犬貓之行為，工區周邊未發現流浪犬貓徘徊之情形。</p> 
3	減輕	施工產生之民生廢棄物，如廚餘等，應妥善包裹並隨每日下工帶離工區，避免吸引流浪犬貓進入工區及野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內及周邊未發現廚餘等民生廢棄物散落之情形。</p> 

4	減輕	施工期間禁止工程相關人員以主動或被動捕捉、騷擾及傷害野生動物，若發現石虎等野生動物於工區受困或受傷，應暫停施作，並立即通報主管機關及保育單位進行處置。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>施工期間尚未發現野生動物受困工區。</p> 
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速限制於30公里以下，減少路殺機會。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區無施工車輛。</p>
6	減輕	以鄰近道路及農路做施工便道或臨時置料區使用，並以裸露地或草地等低敏感區域銜接至施作目標溝渠。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>使用既有草地及農地做施工便道使用，</p> 
7	減輕	工程產生之相關廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工區內未發現廢棄物任意棄置、焚燒及掩埋行為。</p> 
8	迴避	工程施作限於每日早上8點至下午5點，避免晨昏施作，並禁止夜間施作，降低對野生動物活動之干擾。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>工程限制施工時間於早上8點至下午5點間，無夜間施工之情形。</p>
營造單位 單位/職稱 (簽名 日期)		<p>威慶 劉 [redacted] 2/24</p>	營造生態人員 單位/職稱 (簽名 日期)		<p>森莉 執行長 [redacted] 114.2.24</p>	

備註：

1. 本表由營造單位填寫，依據保育措施推動期程自主檢查，並由主辦機關、主辦生態團隊、監造單位協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合格事項，應填寫施工階段W-5.3「生態異常狀況處理表(營造)」進行回報與追蹤。
4. 生態保育策略表格欄位不足請自行增加，辦理兩場以上請依次填寫紀錄表。


W-3.1 施工中生態保育措施抽查表(主辦)				主辦機關			
				設計單位			
工程名稱				生態團隊			
				監造單位			
頭社頂社支線等圳強化工程 (頭社頂社支線)				營造單位			
				施工期程			
114年1月16日~114年7月14日 共179日				抽查日期			
114年02月26日				主辦機關負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)			
李		農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師		營造單位負責人 (單位/職稱)			
劉		威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)			
徐		台灣水資源與農業研究院/研究專員					
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工初期召集承辦人員、廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後未發現野生犬貓	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後無發現民生廢棄物	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無發現野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後相關交通用具皆已撤場	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後農路已復原	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後現場無發現廢棄物	
8	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作皆有避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由主辦機關協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
4. 如抽查有不合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-3.2 施工中生態保育措施抽查表(監造)				主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位			
工程 名稱	頭社頂社支線等圳強化工程 (頭社頂社支線)		施工期程		114年1月16日~114年7月14日 共179日		
			抽查日期		114年02月26日		
主辦機關負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池 工作站/副工程師		監造單位負責人 (單位/職稱)		李■■■ 農田水利署南投管理處魚池工作 站/副工程師	
營造單位負責人 (單位/職稱)		劉■■■ 威慶營造有限公司/負責人		生態人員 (單位/職稱)		徐■■■ 台灣水資源與農業研究院/研究專員	
項次	生態 保育 措施	抽查項目	抽查結果			抽查情形說明	抽查照片
			合格	不合格	尚未執行		
1	減輕	施工人員實施教育訓練。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工初期召集承辦人員、廠商與規劃生態團隊進行保育措施確認	
2	減輕	避免飼養投餵野生犬貓。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後未發現野生犬貓	
3	減輕	施工時產生之民生廢棄如廚餘等，應妥善包裹，避免野生動物誤食。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後無發現民生廢棄物	

4	減輕	施工時禁止相關人員以主動或被動捕捉，騷擾及傷害野生動物。若遇石虎等野生動物於工區受困或受傷應暫時停止施作並立即通報主管機關及保育單位進行處置	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	無發現野生動物受困或受傷	
5	減輕	工區內及周邊施作相關車輛行進時速應限於 30 以下。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後相關交通用具皆已撤場	
6	減輕	以鄰近道路或農路為施工便道及物料暫置區。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後農路已復原	
7	減輕	廢棄物應妥善集中堆放，禁止任意棄置、焚燒及掩埋行為	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完工後現場無發現廢棄物	
8	迴避	工程施作應限於每日早上 8 點至下午 5 點，避免晨昏施作	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程施作皆有避免晨昏施作	
(欄位請自行新增)							

備註：

1. 本表由監造單位填寫，並由主辦機關及生態團隊協助確認。
2. 抽查次數及抽查頻度得視工程實際執行情形調整
3. 如抽查有不合合格事項，應填寫 W-5「生態異常狀況處理表」進行回報與追蹤。

W-4.1 生態異常狀況處理表(主辦)			主辦機關
			設計單位
			生態團隊
			監造單位 營造單位
填表人員 (單位/職稱)		填表日期	年 月 日
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	年 月 日
異常狀況說明		(檢附照片)	
解決對策			
複查人員 (單位/職稱)		複查日期	年 月 日
改善結果	<input type="checkbox"/> 需再行改善：(說明待改善事項) <input type="checkbox"/> 已妥善處理：(說明改善結果)	(檢附改善後照片)	

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**填寫，並由**主辦機關**協助確認。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫，並可視需求**邀請生態團隊**協助。
3. 環境生態異常狀況處理需依次填寫，得自行增加頁面
4. 生態異常情形如應保護之植被遭移除、魚群暴斃、施工便道闢設過大、水質渾濁、民間團體或在地居民陳情等事件。

W-4.2 生態異常狀況處理表(監造)			主辦機關
			設計單位
			生態團隊
			監造單位
			營造單位
填表人員 (單位/職稱)		填表日期	年 月 日
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	年 月 日
異常狀況說明		(檢附照片)	
解決對策			
複查人員 (單位/職稱)		複查日期	年 月 日
改善結果	<input type="checkbox"/> 需再行改善：(說明待改善事項) <input type="checkbox"/> 已妥善處理：(說明改善結果)	(檢附改善後照片)	

備註：

1. 本表由監造單位填寫。
2. 環境生態異常狀況處理需依次填寫，得自行增加頁面
3. 生態異常情形如應保護之植被遭移除、魚群暴斃、施工便道闢設過大、水質渾濁、民間團體或在地居民陳情等事件。

W-4.3 生態異常狀況處理表(營造)			主辦機關 設計單位 生態團隊 監造單位 營造單位
填表人員 (單位/職稱)		填表日期	年 月 日
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	年 月 日
異常狀況說明		(檢附照片)	
解決對策			
複查人員 (單位/職稱)		複查日期	年 月 日
改善結果	<input type="checkbox"/> 需再行改善：(說明待改善事項) <input type="checkbox"/> 已妥善處理：(說明改善結果)	(檢附改善後照片)	

備註：

1. 本表由**營造單位**填寫。
2. 環境生態異常狀況處理需依次填寫，得自行增加頁面
3. 生態異常情形如應保護之植被遭移除、魚群暴斃、施工便道闢設過大、水質渾濁、民間團體或在地居民陳情等事件。

W-5 民眾參與紀錄表			主辦機關
			設計單位
			生態團隊
			監造、營造單位
辦理日期	114年01月22日	現勘/會議/活動名稱	頭社頂社支線等圳強化工程- 施工階段民眾參與
地點	南投管理處 魚池工作站	工程階段	<input type="checkbox"/> 核定階段 <input type="checkbox"/> 規劃設計階段 <input checked="" type="checkbox"/> 施工階段
辦理方式	<input type="checkbox"/> 說明會 <input type="checkbox"/> 訪談 <input checked="" type="checkbox"/> 現勘 <input type="checkbox"/> 工作坊 <input type="checkbox"/> 座談會 <input type="checkbox"/> 公聽會 <input type="checkbox"/> 其他_____		
參加人員	單位/職稱	角色	
黃■	農田水利署南投管理處	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
江■	農田水利署魚池工作站 /站長	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
李■	農田水利署魚池工作站 /副工程師	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
林■	農田水利署魚池工作站 /工程員	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
石■	農田水利署魚池工作站 /工程員	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
石■	農田水利署魚池工作站 /工程員	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
廖■	揚林環境生態有限公司 /專員	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>規劃生態團隊</u>	
劉■	威慶營造有限公司 /工地負責人	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>施工廠商</u>	
林■	財團法人台灣水資源與 農業研究院/研究專員	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>施工生態團隊</u>	
徐■	財團法人台灣水資源與 農業研究院/研究專員	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>施工生態團隊</u>	
意見摘要		處理情形回覆	

<p>魚池工作站李■■■■副工程師意見：</p> <p>金井巷支線工區目前尚未施作，但在工程路線上有一棵大樹，是否可以直接伐除?或是需要做什麼措施?</p>	<p>回覆人員__揚林環境生態有限公司_廖■■■■_：</p> <p>謝謝李副工程師意見，目前經初步判視此樹為火燒柯之樹種，應需為保全對象，保全大樹原則，大多以施工時盡量迴避或保留樹徑30cm 以上之原生樹種為主；如無法迴避，才會建議採取移置策略，且都能與施作廠商進行討論及依據現地狀況調整。</p>
<p>威慶營造有限公司劉■■■■先生意見：</p> <p>目前提出生態保育措施皆可以配合，設置單邊緩坡已利用現地既有環境進行作業。</p>	<p>回覆人員__台灣水資源與農業研究院_林■■■■_：</p> <p>感謝劉先生的配合，就依當時規劃設計階段所提之生態保育措施進行作業，後續工程進行狀況也請劉先生依進度回報給管理處及生態團隊進行追蹤。</p>

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**依機關紀錄摘要整理填寫，由**主辦機關**回覆。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫與回覆，並可視需求**邀請生態團隊**協助工程人員填寫本表。
3. 相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。

※辦理情形照片：



說明：本團隊與魚池工作站於抽查前說明不同階段之生態檢核工作細項流程。



說明：魚池工作站李副工程師說明木屐蘭溪右支線後續施工範圍與方法。



說明：本團隊確認金井巷支線欲施工路線之火燒柯相關資訊。



說明：本團隊與規劃生態團隊、廠商討論新城圳第二支線現場環境狀況，與後續工程施作方式。



說明：本團隊偕同魚池工作站、規劃生態團隊以及施作廠商於頭社頂社支線進行抽查。



※會議簽到表：

『113~114 年度生態檢核作業(開口合約)案』

113 年度南投第一工區「頭社頂社支線等圳強化工程」

施工階段民眾參與 簽到單

主辦機關：農業部農田水利署南投管理處

時間	2025/01/22 上午 09:30		地點	魚池工作站	
出席人員	出席單位	職稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)		備註
	1	南投管理處		黃 [ ]	
	2				
	3	魚池工作站		林 [ ] 石 [ ]	
	4			李 [ ] 石 [ ]	
	5	揚林環境生態有限公司		廖 [ ]	
	6				
	7				
	8	威慶營造		劉 [ ]	
	9				
	10	財團法人台灣水資源與農業研究院		林 [ ]	
	11			徐 [ ]	
12					

備註：相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。

W-5 民眾參與紀錄表			主辦機關
			設計單位
			生態團隊
			監造、營造單位
辦理日期	114年04月21日	現勘/會議/活動名稱	頭社頂社支線等圳強化工程- 專案工程民眾參與
地點	南投管理處 魚池工作站	工程階段	<input type="checkbox"/> 核定階段 <input type="checkbox"/> 規劃設計階段 <input checked="" type="checkbox"/> 施工階段
辦理方式	<input checked="" type="checkbox"/> 說明會 <input type="checkbox"/> 訪談 <input type="checkbox"/> 現勘 <input type="checkbox"/> 工作坊 <input type="checkbox"/> 座談會 <input type="checkbox"/> 公聽會 <input type="checkbox"/> 其他_____		
參加人員	單位/職稱	角色	
王	農田水利署南投管理處 /主任工程師	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
林	農田水利署南投管理處 /工務組長	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
黃	農田水利署南投管理處 /工程員	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
江	農田水利署魚池工作站 /站長	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
李	農田水利署魚池工作站 /副工程師	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
石	農田水利署魚池工作站 /工程員	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
林	農田水利署魚池工作站 /工程員	<input checked="" type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input type="checkbox"/> 其他_____	
王	農田水利署魚池工作站 /小組長	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>在地小組長</u>	
王	農田水利署魚池工作站 /小組長	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>在地小組長</u>	
鄒	農田水利署魚池工作站 /小組長	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>在地小組長</u>	
黃	農田水利署魚池工作站 /小組長	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>在地小組長</u>	
劉	威慶營造有限公司 /工地負責人	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>營造廠商</u>	
林	財團法人台灣水資源與 農業研究院/研究專員	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>主辦生態團隊</u>	
周	財團法人台灣水資源與 農業研究院/研究專員	<input type="checkbox"/> 政府機關 <input type="checkbox"/> 專家學者 <input type="checkbox"/> 陳情人 <input type="checkbox"/> 利害關係人 <input type="checkbox"/> 民間團體 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>主辦生態團隊</u>	

意見摘要	處理情形回覆
<p><u>魚池工作站江■■■</u> 站長 意見： 各個階段生態檢核階段，管理處方是否需要陪同至現地勘查？如有需要，工作站可以全力配合。</p>	<p>回覆人員__台灣水資源與農業研究院_林■■■_： 謝謝江站長意見回應，生態檢核通常分成核定、規劃設計、施工、維護管理四階段，核定階段通常需要主辦陪同至現地勘查，規劃設計階段則是召開地方說明；施工階段，則是需要針對廠商進行教育訓練，至於定期每月的抽查，本團隊依然會詢問工作站是否願意陪同抽查，若有要事也不勉強，我們這邊會將抽查結果再與相關工程負責人進行匯報，討論相關的保育措施。</p>
<p><u>農田水利署南投管理處黃■■■</u> 先生 意見： 簡報裡有提到利用自動相機進行監測，通常在野外這類相機能持續多久？</p>	<p>回覆人員__台灣水資源與農業研究院_林■■■_： 謝謝黃先生提出意見，若以一天拍一張照片為基準，自動相機工作時間至少能運行半年，但若是在動物較為密集的地方，可能一個月就需更換相機電池。</p>

備註：

1. 第一級生態檢核由**生態團隊**依機關紀錄摘要整理填寫，由**主辦機關**回覆。
2. 第二級生態檢核由**主辦機關**填寫與回覆，並可視需求**邀請生態團隊**協助工程人員填寫本表。
3. 相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。

※辦理情形照片：



說明：江站長開場說明生態檢核對於農田工程之必要性。



說明：本團隊負責解說生態檢核作業流程



說明：本團隊針對生態檢核流程明施工前與施工後之中地現況差異。



說明：本團隊針對生態檢核對於農田之重要性。



說明：江站長提問生態檢核各階段流程相關疑問



說明：會後魚池工作站、管理處、小組長之大合照

※會議簽到表：

『113-114年度農田水利署南投管理處生態檢核作業委託服務(第一工區)』

專案工程民眾參與 簽到單

主辦機關：農業部農田水利署南投管理處

時間	114年4月21日 上午10:00		地點	南投管理處魚池工作站	
出席人員	出席單位	職稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)		備註
	1	南投管理處	主任工程師	王 [REDACTED]	
	2		組長	林 [REDACTED]	
	3				
	4				
	5			黃 [REDACTED]	
	6	魚池工作站	站長	林 [REDACTED]	
	7		王鈺塗	王 [REDACTED]	
	8		工程師	林 [REDACTED]	
	9			石 [REDACTED]	
	10		副工程師	李 [REDACTED]	
	11			鄭 [REDACTED]	
12			黃 [REDACTED]		

鄭 [REDACTED]  
廠商 [REDACTED]

『113-114 年度農田水利署南投管理處生態檢核作業委託服務(第一工區)』

專案工程民眾參與 簽到單

主辦機關：農業部農田水利署南投管理處

時間	114 年 4 月 21 日 上午 10:00		地點	南投管理處魚池工作站		
出席人員	出席單位	職稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)		備註	
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11	台灣水資源與農業 研究院	研究專員	林 [REDACTED]		
	12					

備註：相關參與人員姓名請自行遮蔽後再進行資訊公開。
